



PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

ESTADO DO PARANÁ

Alameda David Carneiro, 243 - Centro

CEP 83750-000 - (41) 3547-8000

www.lapa.pr.gov.br

Ofício nº 134/2020 – GAB

Lapa, 21 de Abril de 2020.

Ref.: Ofício nº 108/2019-PRESI/SEC

Câmara Municipal da Lapa - PR



PROTOCOLO GERAL 255/2020

Data: 21/04/2020 - Horário: 14:16

Administrativo

Senhor Presidente,

Em vista ao ofício nº 108/2020, onde solicita informações e esclarecimentos sobre o Projeto de Lei nº 14/2020 sobre abertura de Crédito Especial em que requer explicações com relação a prestação de contas do convênio do Parque Linear do Município, segue detalhadamente essas informações.

HISTÓRICO

O córrego das Neves que corta a área urbana da Lapa, alimenta uma série de veios d'água e ao final de seu curso em épocas de precipitações pluviométricas intensas, provocavam alagamentos que causavam inúmeros prejuízos materiais e até pessoais graves.

Ainda no meu primeiro mandato (2001 a 2004) fizemos várias ações para encontrar uma solução definitiva, mas esbarramos sempre no grande volume de recursos exigido e que os cofres municipais não teriam como suportar.

Quando assumi em 2009, através do Deputado Federal João Arruda, participei de reunião com o Ministro do Turismo e solicitei convênio para licitar um projeto executivo, para na sequência pleitear recursos para a execução de obra, tanto de resolução das enchentes como na urbanização.

Através de convênio específico foi liberado recursos para o projeto executivo e que após contratado, fizemos então o pleito de recursos para execução da obra para dois Ministérios: Da Integração Nacional para execução de Obras de infraestrutura e do Turismo para urbanização de 1,7 km de Parque.

Este pleito foi aceito pelos dois Ministérios. Após a garantia dos recursos procedemos a licitação destes convênios.

A prestação de contas junto ao Ministério da Integração foi totalmente aprovada.

O convênio do Parque Linear chamaremos de **CONVÊNIO 01**.

O outro convênio em questão, foi com o Ministério do Turismo para realização de novo projeto, desta feita para atender duas regiões: Bairros Cidade Nova e Jardim Esplanada.

Este convênio, chamaremos de **CONVÊNIO 02**.

X



PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

ESTADO DO PARANÁ

Alameda David Carneiro, 243 - Centro

CEP 83750-000 - (41) 3547-8000

www.lapa.pr.gov.br

CONVÊNIO 01 – MINISTÉRIO DO TURISMO –

A obra foi inaugurada em 15 de dezembro de 2012, completamente concluída.

Durante a execução da obra ela sofreu tanto vistorias do próprio Ministério do Turismo como fiscalizada pelo Eng. Civil Antonio Carlos Pasdiora que conferia e atestava as notas para pagamento.

Vistorias técnicas realizadas pelo Ministério do Turismo:

04/11/2010

03/02/2011

05/05/2011

27/10/2011

26/04/2017

RESSALTE-SE QUE A ÚLTIMA VISTORIA TÉCNICA FOI QUASE 06 ANOS APÓS A ANTERIORMENTE REALIZADA.

Todos os documentos, medições, atestados e notas eram enviados para a Secretaria de Planejamento que em pasta específica os armazenava para posterior prestação de contas.

Após a inauguração em 15/12/2012 a obra estava praticamente em condições de ser definitivamente recebida, e apenas não ocorreu porque restava um pagamento de serviços extras, autorizados pelo Ministério no valor de R\$ 142.382,08. Mesmo assim em 01 de fevereiro de 2013 a administração 2013/2016 enviou a prestação de contas, sem, no entanto, ter a Prefeitura pago o valor mencionado. Valor este que somente foi pago em Março de 2013.

Observe-se que a após a prestação de contas, permanecer em análise por mais de 04 anos, somente em 28 de abril de 2017 uma nova vistoria foi realizada pelo Ministério do Turismo que gerou um relatório da vistoria 018/CGAS/DIETU/2017 de 26/04/2017. Este relatório foi enviado em 22/08/2017. **(Anexo DOC I)**

Em 29 de agosto solicitei a Secretaria de Obras sobre as observações feitas e providências para sanar pontos levantados.

7



PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

ESTADO DO PARANÁ

Alameda David Carneiro, 243 - Centro

CEP 83750-000 - (41) 3547-8000

www.lapa.pr.gov.br

PONTOS EM DESTAQUE DO RELATÓRIO

- Obra finalizada
- Em função da quantidade de água vinda da Br-476 necessidade de adequação do talude
- Ressalta que os novos postes substituídos não são coincidentes com o que consta no plano de trabalho
- Falta de manutenção na área de banheiros
- Falta de manutenção nas churrasqueiras
- Falta de manutenção nas quadras esportivas
- Indica falta de manutenção dos canais com comprometimento do lago.
- Falta de conservação da grama plantada
- Paisagismo deficiente por falta de manutenção da praça quebra pote
- Indica necessidade manutenção e a adequada drenagem da encosta junto a BR-476

Não foram observadas irregularidades a ponto de comprometer o cumprimento do objeto conveniado, mas pede atenção para manutenção e vigilância para evitar o vandalismo.

Informa que a execução física perfaz quase 100 por cento dos serviços.

COMENTÁRIOS- FOTOS CADERNO 2

Não há dúvida que a administração 2013-2016 praticamente abandonou a manutenção do parque. É público e notório, pois quando foi entregue a administração estava tudo em perfeita ordem. Quando recebemos em 2017 muita coisa depredada e até o lago totalmente entupido.

A prova disso é que existia até maio de 2013 caução para garantir a Prefeitura de que se alguma ação não tivesse sido feita conforme o contrato, esta caução poderia ser executada. Como não ocorreu, a premissa é de que não foi verificada nenhuma irregularidade.

Houve ação em 2016 com a instalação de novas postes, luminárias e rede elétrica. Esta intervenção foi realizada numa obra ainda sem recebimento definitivo, sem a prestação de contas aprovadas e mais grave, inúmeros postes arrancados do lugar e outros deixados abandonados.

Apenas em outubro de 2018 o Ministério do Turismo enviou Parecer Financeiro e Técnico. **(DOC II)**

7



PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

ESTADO DO PARANÁ

Alameda David Carneiro, 243 - Centro

CEP 83750-000 - (41) 3547-8000

www.lapa.pr.gov.br

Em 08 de novembro de 2018 enviamos ofício (**DOC III**) informando a retomada que já estava em andamento a manutenção e a recuperação do lago que estava completamente assoreado. E ainda o entendimento com a Caminhos do Paraná sobre desague irregular de água da BR-476 que prejudicava o talude. Obra esta que foi realizada com custos integrais pela Caminhos do Paraná.

Em 2019 por três vezes fui pessoalmente até a área técnica do Ministério do Turismo dialogar para tentar uma solução. Até que da última vez o atendente de maneira informal respondeu que não via possibilidade de mudar o parecer técnico e que concluído iria para a inadimplência junto ao Siconv. A inadimplência junto ao Siconv impediria o Município de receber recursos da União através de convênios. O relatório sobre o convênio do Chefe da Divisão de Convênios Denis Magalhães Coelho, apontava as inúmeras tentativas de solucionar, sem respostas conclusivas.

GLOSAS QUE CONSTAM NO PARECER TÉCNICO

Consta no item 2.2 da análise

- a) Poste em aço reforçado padrão Republicano, com 01 luminária em policarbonato em desacordo com o projeto. Banco de praça padrão- pés em ferro fundido 5 tábuas de imbuia em desacordo com o projeto.
- b) Transporte de equipamentos pesados, ferramentas, equipamentos de escritório, de refeitório e alojamento, glosa de R\$ 20.699,00
- c) Foi identificado uma discrepância entre as notas fiscais e o valor medido de R\$ 42.126,43.
- a) Postes: Foram colocados inicialmente conforme o projeto original 25 postes ao custo unitário de R\$ 3.672,42 e depois com recursos auferidos de aplicação e autorizados pelos Ministério mais 24 em torno do lago. Dos 24, postes efetivamente implantados, na vistoria de 2017 pelo Ministério do Turismo, não foram encontrados fisicamente que junto com material de instalação somou uma glosa de R\$ 101.646,08. Outros 17 foram encontrados abandonados cuja glosa somou R\$ 62.552,00
- b) Bancos de praça: Na vistoria por ação de vandalismo e roubo foi verificado a falta de 37 bancos que ao custo unitário de R\$ 433,71 somou uma glosa total de R\$ 16.047,27
- c) Quando os serviços foram iniciados, foi constatado que a rede de esgoto tinha comprometimentos estruturais. Em acordo com a Sanepar ela forneceu o material e através do convênio foi pago R\$ 20.699,00 de equipamento e mão de obra. O serviço foi realizado e atestado, mas como não fazia parte do projeto não foi aceito.
- d) Quando da prestação de contas realizada em 2013, não foi conferida com exatidão as notas e as medições enviadas. Nenhuma nota é emitida sem a devida medição acompanhar junto com o atestado. Por uma falha na prestação de contas houve essa discrepância. O problema enfrentado foi que pelo lapso de tempo entre a prestação e a irregularidade apontada, 05 anos, não conseguimos encontrar nos arquivos toda a documentação para poder contestar. A diferença glosada foi de R\$ 42.126,43.



PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

ESTADO DO PARANÁ

Alameda David Carneiro, 243 - Centro

CEP 83750-000 - (41) 3547-8000

www.lapa.pr.gov.br

A vistoria conforme DOC I glosou os valores abaixo:

- a) R\$ 164.168,57 - Postes e rede elétrica efetivamente implantados e atestados, mas não encontrados ou inservíveis.
- b) R\$ 16.047,27 – Bancos de praça implantados e atestados, mas não encontrados.
- c) R\$ 20.699,00 – Serviços realizado fora do projeto, correção da rede de esgoto.
- d) R\$ 42.126,43 – Prestação deficiente sem anexação de medição

TOTAL GLOSADO R\$ 243.041,27

FALHAS NA GESTÃO DO PARQUE A PARTIR DE 2013

No início de 2013 o Engenheiro Antonio Carlos Pasdiora, produziu um termo de recebimento da obra, pois estava finalizada e conferida e encaminhou para Anderson a quem estava subordinado o Parque Linear.

(Anexo DOC IV)

No documento anexo pode-se ler escrito a mão no termo sugerido:

“ A essa época o Anderson não quis assinar o recebimento da obra, pois havia um pequeno problema no talude do lago. Poderia ter usado a caução até 31 de maio de 2013 e receber a obra”

Também no termo de recebimento sugerido, escrito a mão:

“ Se havia problemas, o Anderson, responsável nessa gestão pelo parque, deverá já que a empresa não o atendeu, usar a caução válida até 31/05/2013 e solucionar o problema que é ínfimo e receber a obra”

Em 02 de abril de 2014 o Engenheiro Pasdiora enviou documento (anexo) para o Departamento de Convênios alerta para que as providencias fossem tomadas no sentido de receber a obra e esclarece que até as prestações de contas foram enviadas. (Anexo DOC V)

Em outro documento de sugestão de recebimento da obra datado de 15 de abril consta anotação a mão: (Anexo DOC VI)

“O Anderson Diretor de Saneamento Ambiental não permitiu as assinaturas”

PORTANTO NÃO HOUVE NENHUMA AÇÃO TANTO PARA ACIONAR A CAUÇÃO SE FOSSE O CASO COMO PARA RECEBER A OBRA.

Em 08 de julho de 2015, portanto 01 ano depois, em novo ofício o Eng. Pasdiora pede desculpas pela insistência e reitera o ofício de 2014 pois nenhuma atitude havia sido tomada e esclarece que tal desídia poderia acarretar problemas futuros.

(Anexo DOC VII)

Tivesse sido adotada a providência de receber a obra em 2013 e feita a prestação de contas, o MT teria a obrigação de vistoriar em seguida.. Com isso toda a documentação estaria com certeza arquivada e os aparelhos seriam encontrados em perfeita ordem.

7



PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

ESTADO DO PARANÁ

Alameda David Carneiro, 243 - Centro

CEP 83750-000 - (41) 3547-8000

www.lapa.pr.gov.br

CONVÊNIO 02

Para resolver o problema de outros cursos d'água na Vila do Príncipe e Jardim Esplanada e com o exemplo da implantação do Linear conseguimos recursos para um novo projeto.

O convênio foi assinado em 28 de fevereiro de 2010 e constava as seguintes etapas de trabalho:

- 1- Relatório Prévio
- 2- Levantamento Topográfico
- 3- Anteprojeto
- 4- Projeto Básico
- 5- Projeto Executivo

Feita a licitação a empresa vencedora foi Christine Morva Martins Arquitetura

O Custo do Projeto foi de R\$ 294.000,00 com contrapartida de R\$ 6.000,00 do Município

Os trabalhos foram executados e o projeto entregue e atestado.

A prestação de contas foi efetuada em 22 de março de 2014 e não foram inseridos os relatórios físicos. Foram anexados as notas pagas e o atestado de recebimento dos produtos contratados.

É importante esclarecer que nenhuma nota foi paga sem a entrega física do produto. Estes produtos não eram imediatamente anexados no sistema, mas arquivados numa pasta específica na Secretaria de Planejamento, para posterior prestação de contas.

Apenas em 2018 houve manifestação do Ministério do Turismo, quando solicitou complementação dos itens faltantes.

Em 14 de junho de 2018 o Chefe da Divisão de Convênios e Contratos de repasse Denis Magalhaes Coelho enviou informação e a documentação faltante inserida no sistema Siconv. **(DOC VIII).** Nossa equipe realizou buscas na Secretaria do Planejamento, mas pelo tempo decorrido foram encontradas as notas e atestados, mas não os documentos físicos.

7



PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

ESTADO DO PARANÁ

Alameda David Carneiro, 243 - Centro

CEP 83750-000 - (41) 3547-8000

www.lapa.pr.gov.br

A empresa contratada à época foi localizada e apesar de desativada há alguns anos localizou apenas o anteprojeto. **(Anexo e apensos DOC IX)**

Na sequência produzimos um relatório explicativo, comprovando o uso adequado dos recursos e provamos que para ter o produto projeto executivo somente seria possível se estes objetos tivessem sido realizados. **(Anexo DOC X)**. Além disso, enviei ofício em 30 de julho **(Anexo DOC XI)**, que solicitava a juntada do anteprojeto e a revisão da glosa do relatório prévio, com as devidas justificativas. Neste caso o Ministério já havia colocado a Prefeitura da Lapa como inadimplente junto ao Siconv. Pelos documentos encontrados, insistimos conforme ofícios em anexo. Diante da intransigência, nos restava a demanda judicial que enquanto perdurasse, permaneceríamos no cadastro negativo do Siconv, por isso optei por fazer um acordo no sentido de evitar o bloqueio de recursos de convênios da União. A glosa do relatório prévio foi de R\$ 45.000,00 e do anteprojeto R\$ 60.000,00 dos valores originais em 2010 somando R\$ 105.000,00 sendo a parte do Ministério R\$ 102.761,69 e que foram atualizados e perfazendo R\$ 205.195,00.

Sem mais, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


PAULO CESAR FIATES FURIATI
Prefeito Municipal

Exmo. Senhor

ARTHUR BASTIAN VIDAL

DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Lapa - PR



PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

ESTADO DO PARANÁ

Alameda David Carneiro, 243 - Centro

CEP 83750-000 - (41) 3547-8000

www.lapa.pr.gov.br

CADERNO 01

- ANEXOS REPOSTA DO OFICIO Nº 108/2020 -

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA

DOCUMENTO I - Página 01 à 057

DOCUMENTO II - Página 01 à 014

DOCUMENTO III - Página 01 à 004

DOCUMENTO IV - Página 01 à 057

DOCUMENTO V - Página 01

DOCUMENTO VI - Página 01

DOCUMENTO VII - Página 01

DOCUMENTO VII - Página 01

DOCUMENTO IX - Página 01 à 022

DOCUMENTO X - Página 01

DOCUMENTO XI - Página 01 à 010



MINISTÉRIO DO TURISMO
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

Ministério do Turismo - Esplanada dos Ministérios, Bloco U, Sala 341 - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70065-900
Telefone: (61) 2023-7840 - www.turismo.gov.br

Ofício nº 357/2017/DIETU/SNETur

Brasília-DF, 22 de agosto de 2017.

A Sua Excelência o Senhor

PAULO CÉSAR FIATES FURIATI

Prefeito do Município de Lapa/PR

Prefeitura Municipal de Lapa/PR

Alameda David Carneiro, 243 - Centro

83.750-000 – Lapa – PR

Assunto: Encaminhamento de Relatório de Vistoria – Convênio nº 727325/2009.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos, em anexo, cópia do Relatório de Vistoria nº 018/CGAS/DIETU/2017 de 08/08/2017, referente à visita técnica "in loco", ocorrida no dia 26/04/2017, às obras do Convênio nº 727325/2009, que visa à "Execução de Obras de Infraestrutura Turística a fim de qualificar o Circuito Histórico e Ambiental da Lapa-PR", para conhecimento e eventuais providências.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre do Nascimento Mangini, Coordenador(a)-Geral**, em 22/08/2017, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Aguiar Fonseca da Mota, Diretor(a)**, em 22/08/2017, às 17:06, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Geraldo Melo Corrêa, Chefe de Gabinete**, em 23/08/2017, às 16:31, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://validacao.turismo.gov.br>, informando o código verificador **0112146** e o código CRC **8841B473**.

A SECRETARIA DE OBRAS

ENCAMINHO PARA
CONHECIMENTO.

A VISTORIA COMPLETA
APROVA O CONVÊNIO,
PORÉM FAZ ALGUMAS
OBSERVAÇÕES ESPECIAL-
MENTE NO QUE CONCEPNE
A FALTA DE MANUTENÇÃO
E VANDALISMO.

SOLICITO ATENDER
AS RECOMENDAÇÕES
COM VU JERO PARA
SALAR OS BONTOS
LEVANTADOS.

ZAKOS/HZ

Paulo César Farias Furtado
PREFEITO MUNICIPAL

AO ENGº FERNANDO
PARA PROVIDÊNCIAS

05/09/17
Rafael José Farias Furtado
Secretário de Obras, Urbanismo,
Planejamento e Transportes
Decreto nº 22416 de 16 Janeiro de 2017

MINISTÉRIO DO TURISMO SECRETARIA NACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO - SNETur DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - DIETU	MINISTÉRIO DO TURISMO EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA Nº 018/2017	
DATA 08 de agosto de 2017	AUTOR: Roberto de Paula Pinto Engenheiro Agrônomo	<i>Roberto de Paula Pinto</i> Engenheiro-SIAPE: 1881362 DIETU/SNETur/MTur SIAPE: 1891362
N.º DO RELATÓRIO DE VISTORIA 018/CGAS/DIETU/2017	CONFERIDO: Pedro Henrique Teles de Carvalho Engenheiro Civil	<i>Pedro Henrique Teles de Carvalho</i> Engenheiro-SIAPE: 2136385 DIETU/SNETur/MTur CREA: 21757/D - GO
N.º DO ARQUIVO	COORDENADOR: Alexandre do Nascimento Mangini Engenheiro Civil	<i>Alexandre do Nascimento Mangini</i> Coordenador-Geral de Acompanhamento e Supervisão de Obras de Infraestrutura Turística CREA: 7457/D - GO
SUBSTITUI A: / SUBSTITUIDO POR:	DIRETOR: Felipe Aguiar Fonseca da Mota	<i>Felipe Aguiar Fonseca da Mota</i> Diretor de Infraestrutura Turística DIETU/SNETur/MTur

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria
		Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 2/6

I. OBJETO.

Convênio Nº 727325/2009 – Execução de obras de infraestrutura turística a fim de qualificar o Circuito Histórico e Ambiental da Lapa-PR.

Local: Município de Lapa - PR.
Data da vistoria: 26 de abril de 2017.
Técnicos Vistoriadores: Pedro Henrique Teles de Carvalho e Roberto de Paula Pinto
Anexos: Relatório Fotográfico.
Processo n.º: 72031.006701/2009-42.

II. OBJETIVO.

A vistoria refere-se ao objeto do Convênio firmado entre o Ministério do Turismo e a Prefeitura Municipal da Lapa. Faz parte das devidas ações de acompanhamento do instrumento de transferência voluntária, com vistas à verificação das condições de execução e conservação das estruturas e sistemas já concebidos, bem como o andamento dos serviços no que tange à conformidade com o Plano de Trabalho aprovado e documentos correlatos, presentes nos autos.

III. DADOS DO CONVÊNIO.

Assinatura: 30/12/2009.


Vigência: 31/12/2012.

Valor: (R\$)	Concedente	9.619.670,82
	Conveniente:	196.462,67
	Rendimentos:	<u>142.382,08</u>
	Total:	9.958.515,57

IV. VISTORIA

A inspeção foi realizada no dia 26/04/2017 em companhia do Engenheiro Civil Antônio Carlos Pasdiora da Prefeitura Municipal da Lapa, que forneceu informações a respeito das obras. Percorreu-se toda a extensão do trecho objeto do Convênio.

A “Execução de obras de infraestrutura turística a fim de qualificar o circuito histórico e ambiental da Lapa”, objeto deste convênio, tem como finalidade executar as soluções técnicas previstas nos projetos de arquitetura e engenharia desenvolvidos para promover a melhoria da acessibilidade, da circulação de pedestres e veículos; promover a integração dos bens tombados aos

Autor 	Conferido 	Coordenador 	Diretor 
--	--	---	--

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 3/6

demais equipamentos turísticos; preservar os córregos do município, ruas e praças, além de incrementar o potencial turístico existente no município.

Essa obra visa a recuperação, estruturação e canalização do Córrego Passo dos Neves com a criação de um parque linear. Assim, pretende-se gerar a manutenção e preservação desse córrego, bem como o controle das cheias. Além do Parque Linear, o recurso deste convênio será destinado à recuperação e revitalização da Praça da Bica do Pote.

O Plano de Trabalho prevê os seguintes serviços:

- **Meta 1 – Execução da canalização do Córrego dos Neves:**
 - ✓ Serviços Iniciais;
 - ✓ Serviços de Canalização.
- **Meta 2 – Execução da Urbanização Parque dos Neves e Rua Barão de Campos Gerais.**

Dessa forma, foram vistoriados os serviços correspondentes à execução da canalização do córrego com galerias retangulares em concreto pré-moldado, do pórtico de acesso em troncos de eucalipto com 25 cm de diâmetro, do sanitário público, dos quiosques de churrasqueiras, do pontilhão sobre o córrego, do deck de madeira sobre o lago, da ciclovia, da ponte variável, das quadras poliesportivas, da academia de ginástica para a terceira idade, dos estacionamentos nos acessos ao Parque Linear Passo dos Neves e das intervenções na Praça Bica do Pote.

A obra já foi objeto de inspeções anteriores, de forma que foi constatado bom avanço físico desde a última inspeção realizada, verificando-se que a obra se encontra finalizada.

No início da área de intervenção das obras, principal acesso ao município, pode-se observar que a proteção das margens com alvenaria de pedras e a hidrossemeadura dos taludes foram concluídas. Entretanto, em razão de um período chuvoso, uma grande quantidade de água incidiu sobre uma das linhas de drenagem e em decorrência do grande volume escoado, uma parte do talude do lago não suportou e acabou escorregando sobre o espelho d' água do lago. Sendo assim, a vistoria observou que o talude se apresenta estável atualmente.

Autor	Conferido	Coordenador	Diretor
-------	-----------	-------------	---------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 4/6

Os equipamentos de contemplação, como o deck de madeira e a própria passarela sobre o Córrego Passo dos Neves, se encontram com pequenas avarias, como na passarela existe guarda corpo faltante e no deck há madeira do piso danificada,

O pórtico que sinaliza o acesso ao parque está em obras, como demonstrado no arquivo fotográfico.

O sistema elétrico implantado ao longo do parque estava sofrendo com constantes atos de vandalismo, por isto a Administração do Município resolveu trocar os postes e o sistema elétrico para evitar o vandalismo, sendo assim os postes existentes na obra não são coincidentes com os do plano de trabalho. Entretanto, restaram o poste com o maior número de luminária e os seis postes instalados na praça da Bica do Pote.

Com referência as instalações elétricas, estas também foram substituídas para atender a demanda dos novos postes e ficaram mais protegidas de vandalismo.

Na edificação destinada às instalações sanitária verificou-se ação de vandalismo e falta de manutenção, com louças faltantes, equipamentos quebrados e vidros quebrados. Na parte externa a pintura foi realizada.

No prédio destinado à administração do parque, verificou que a fachada foi pintada, entretanto não foi possível a análise da parte interna, pois o mesmo encontrava-se trancado.

Os sete quiosques com churrasqueiras encontravam finalizados, entretanto apresentando características de uso e também vandalismo, com danos as mesas de concreto, telhas faltantes e danos aos bancos de concreto.

A academia da terceira idade, que já se encontra em uso pela comunidade apresenta bom estado de conservação, sem sinais de danos causados pela sua má utilização.

As quatro quadras poliesportivas verificaram-se que alguns aros de tabela de basquetebol encontram-se faltantes ou danificados e há danos nas estruturas das traves e/ou estão faltando, também há grades com buracos e falta de portas em algumas quadras. Entretanto, a pintura

Autor	Conferido	Coordenador	Diretor
-------	-----------	-------------	---------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 5/6

demarcatória dos pisos está presente. Observou-se, em uma das quadras, o acúmulo de águas pluviais, evidenciando problemas no seu nivelamento o qual já foi evidenciado em vistorias anteriores.

A canalização do Córrego Passo dos Neves se encontrava finalizada. Também foi possível constatar a execução de toda a rede de micro drenagem lateral ao canal. Cabe observar, que o canal apresenta bastante material carreado o que compromete a integridade do lago artificial.

A cobertura vegetal das margens do canal encontrava-se concluída, no entanto cabe ressaltar a presença de espécies invasoras no gramado que podem prejudicar a conservação da grama plantada no local. Também cabe ressaltar que houve a mortalidade das plantas usadas para paisagismo de praticamente cem por cento (100%).

A ciclovia que percorre o Parque Linear possui 1,20 m de largura, bordas em paralelepípedo, pavimento em CBUQ e está finalizada. Verificou-se que a Conveniente executou, com recursos próprios, um trecho paralelo à ciclovia prevista no Plano de Trabalho, com blocos pré-moldados de concreto, de forma a aumentar a largura para um melhor aproveitamento.

Ao longo do trecho vistoriado, constatou-se a falta do revestimento CBUQ em pequenos trechos, provavelmente usados para passagem de água e/ou rede elétrica, além de falhas pontuais caracterizadas pela dilatação térmica do material ou pela ineficiência da compactação da sub-base.

As praças existentes ao longo da ciclovia, bem como nos pontos de transposição das ruas que cruzam o canal pode-se observar falhas no acabamento, especialmente nos pontos de transição entre as faixas de CBUQ, que não estavam previstas no projeto original (a previsão era de piso cimentado alisado com seixo) e as faixas de paralelepípedos.

Também foi constatado sinais de recalque, especialmente nos pontos mais externos das várias pequenas praças. O fato ocorre em função da baixa compactação do solo sob o pavimento e também pela ausência de vegetação que auxilia na contenção do solo, tendo em vista que muitas destas praças estão junto a pequenos taludes nas proximidades das margens do curso d' água canalizado.

Os serviços na Praça da Bica do Pote foram concluídos, entretanto o acabamento de paisagismo encontra-se deficiente ou inexistente, com relação a manutenção a sinais de desgaste e de vandalismo, as quadras poliesportivas também apresentam acúmulo de água e como verificado em

Autor	Conferido	Coordenador	Diretor
-------	-----------	-------------	---------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 6/6

vistorias anteriores as tabelas de basquetebol estão faltantes ou danificadas, com relação as traves estas encontram-se presente em estado precário.

A praça apresenta pontos de vandalismo e de ação de uso.

Acerca da realização dos itens supracitados, não foram encontradas patologias ou falhas graves de execução, de sorte que se verificou a boa concepção desses serviços, apresentados no relatório fotográfico anexo. Porém, em decorrência das observações em campo faz-se de extrema importância a manutenção preventiva, especialmente dos trechos em utilização pela comunidade. Também é importante uma melhor avaliação da questão da drenagem pluvial, especialmente ao redor do lago artificial, uma vez que o grande volume de água que provém das encostas ao seu redor pode causar outros desmoronamentos, além da manutenção do próprio canal para evitar assoreamento no lago e diminuição da lâmina d'água.

V. CONCLUSÃO

Com base no conteúdo ora versado, obtêm-se as seguintes conclusões:

1. Pode-se afirmar que as etapas executadas guardam consonância com o convênio, de forma que não foram observados, nesta ocasião, danos ou irregularidades a ponto de comprometer o cumprimento do objeto conveniado. No entanto, reitera-se que a Conveniente se atente para a questão das ações de vandalismo que cercam a obra, a fim de coibir estas ações visando uma melhor conservação dos equipamentos construídos.
2. A execução física perfaz, conforme observado, a quase totalidade dos serviços preconizados, alcançando índices em torno de 100%.
3. Está vistoria é a final e apresentou algumas divergências de serviços conforme relatado ao longo deste relatório os quais serão mensurados no Parecer final de Prestação de Contas.
4. Recomenda-se notificar a Conveniente acerca das considerações deste relatório.

Faz-se anexar relatório fotográfico.

Autor	Conferido	Coordenador	Diretor
-------	-----------	-------------	---------

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Convênio Nº 727325/09 – Execução de Obras de Infraestrutura Turística a fim de qualificar o Circuito
Histórico e Ambiental da Lapa-PR
Vistoria: 26 de Abril de 2017



MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017
		FOLHA: 2/49

PRAÇA BICA DO POTE



Figura 1 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Visão geral da praça executada, cabe observar os postes dentro do padrão.



Figura 2 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Detalhe do sistema de iluminação pública da praça

Autor	Conferido	Coordenador	Diretor
-------	-----------	-------------	---------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria
		Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 3/49





Figura 3 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Visão geral da academia pública da praça.



Figura 4 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral da praça. Observa-se ao fundo o espaço destinado ao playground, que se encontra subutilizado em função dos poucos brinquedos instalados, cabe observar que existem menos brinquedos do que na última vistoria.

Autor 	Conferido 	Coordenador 	Diretor 
--	--	---	--

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria
		Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 4/49



Figura 5 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral da praça. Observa-se ao fundo a quadras poliesportivas e sua respectiva iluminação.



Figura 6 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral da praça. Observa-se ao fundo a quadras poliesportivas com danos no alambrado e falta de portas.



Figuras 7 e 8 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral da praça. Observa-se ao fundo a quadras poliesportivas com danos ao alambrado, falta de portas, tabelas de basquete danificadas ou ausentes, traves danificadas e acúmulo de água excessivo em uma das quadras demonstrando problemas de nivelamento.



Figuras 9 e 10 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral da praça. Observa-se ao fundo a quadras poliesportivas com danos ao alambrado, falta de portas, tabelas de basquete danificadas ou ausentes, traves danificadas e acúmulo de água excessivo em uma das quadras demonstrando problemas de nivelamento.



Autor	Conferido	Coordenador	Diretor

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria
		Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 5/49



Figura 11 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral da praça. Observa-se ao fundo a vista da antiga fonte de cantaria.



Figuras 12 e 13 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral da praça. Observa-se a ponte de madeira em toras de eucalipto tratado.

Autor	Conferido	Coordenador	Diretor
--------------	------------------	--------------------	----------------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria
		Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 6/49

Folha
Nº 14
8



Figura 14– Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.
Vista geral da praça. Observa-se o detalhe do piso implantado na praça, localizada no centro histórico da cidade.



Figuras 15 a 18– Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.
Vista geral da praça. Observa-se o detalhe do piso implantado na praça, que é o mesmo localizado no centro histórico da cidade e também pode ser observado as jardineiras bastante danificadas pelo vandalismo.

Autor ✓	Conferido PML	Coordenador A	Diretor [Assinatura]
------------	------------------	------------------	-------------------------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria
		Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 7/49




Figura 19 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral da praça. Observa-se a borda da praça margeando a pista com o detalhe do piso implantado na praça, que é o mesmo localizado no centro histórico da cidade.



Figura 20 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral da praça. Observa-se a borda da praça margeando a pista com o detalhe do piso implantado na praça, que é o mesmo localizado no centro histórico da cidade.

Autor 	Conferido 	Coordenador 	Diretor 
--	--	---	--

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria
		Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 8/49



Figura 21 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral da praça. Observa-se o detalhe da iluminação implantada na praça verifica-se seis postes modelo histórico e seis postes de iluminação das quadras poliesportivas.



Figura 22 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral da praça. Observa-se a lixeira da Praça.

Autor ✓	Conferido MCC	Coordenador A	Diretor [Signature]
------------	------------------	------------------	------------------------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017
		FOLHA: 9/49



Figura 23 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral da praça. Observa-se a presença de invasoras no gramado o que pode ocasionar danos ao mesmo.

Trecho executado pelo Convênio na ligação entre a praça e o Parque linear



Figura 23 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral da ligação entre a praça e o parque linear: Observa-se o calçamento.

Autor	Conferido	Coordenador	Diretor
-------	-----------	-------------	---------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017
		FOLHA: 10/49



Figuras 24 a 27 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral da ligação entre a praça e o parque linear: Observa-se o calçamento com presença de vegetação e danos por uso.

Autor 	Conferido 	Coordenador 	Diretor
-----------	---------------	-----------------	-------------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009	Relatório de Vistoria Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 11/49



Figuras 28 a 31 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral da ligação entre a praça e o parque linear: Observa-se o calçamento com presença de vegetação, danos por uso e presença de recalques.

Autor	Conferido	Coordenador	Diretor
-------	-----------	-------------	---------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017
		FOLHA: 12/49

PARQUE LINEAR

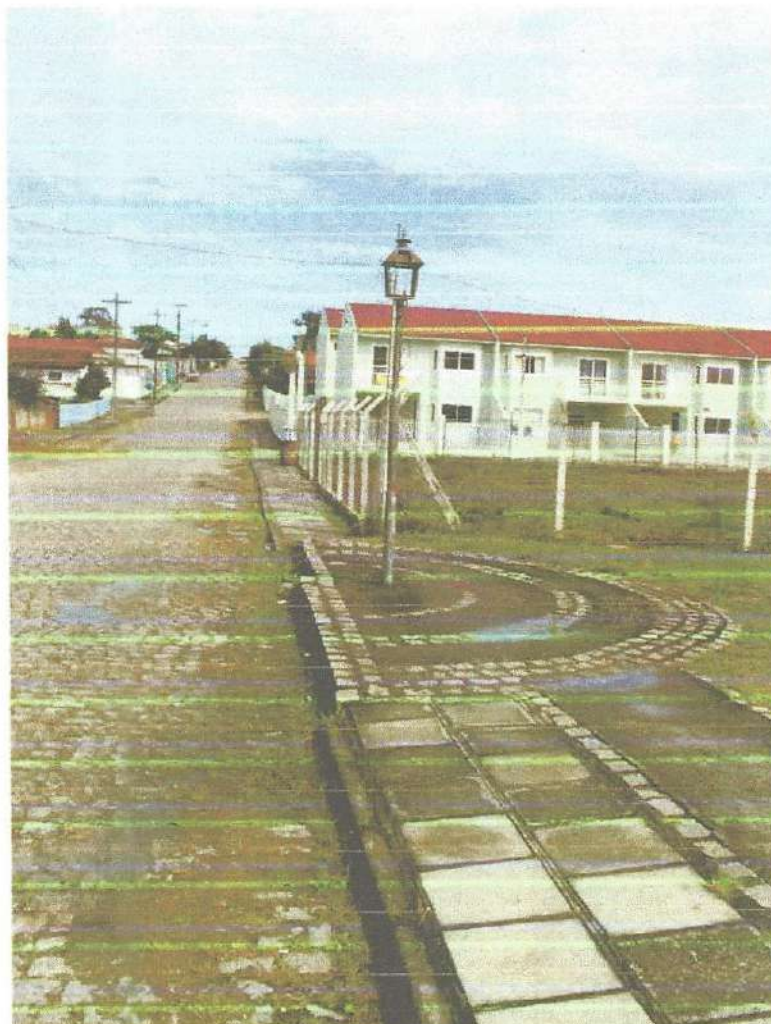



Figura 32 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral da ligação entre a praça e o parque linear: Observa-se o fim do calçamento e início do Parque Linear. Presença de poste no modelo do convênio, entretanto sem funcionalidade.

Autor 	Conferido 	Coordenador 	Diretor 
--	--	---	--

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria
		Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 13/49



Figura 33 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.
Vista geral do parque linear: Observa-se o canal e a ciclovia ao lado.



Figura 34 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.
Vista geral do parque linear: Observa-se a ciclovia com fissuras no CBUQ.

Autor	Conferido	Coordenador	Diretor

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria
		Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 14/49



Figuras 35 e 36 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral do parque linear: Observa-se a micro praça com intersecção com uma avenida, verifica-se que os postes do modelo do convênio não estão funcionais, se, as respectivas lanternas com presença de vandalismo.

Autor	Conferido	Coordenador	Diretor
-------	-----------	-------------	---------

[Handwritten signature]

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017
		FOLHA: 15/49



Figura 37 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.
Vista geral do parque linear: Observa-se o canal e a ciclovia, entretanto a parte de paisagismo arbóreo está inexistente e o gramado apresenta espécies invasoras.



Figuras 38 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.
Vista geral do parque linear: Observa-se a falha na continuidade da ciclovia, ausência do CBUQ.

Autor <i>[Handwritten signature]</i>	Conferido <i>[Handwritten signature]</i>	Coordenador <i>[Handwritten signature]</i>	Diretor <i>[Handwritten signature]</i>
---	---	---	---

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017
		FOLHA: 16/49



Figura 39 e 40 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral do parque linear: Observa-se o canal e a ciclovia, ao aproximar de um micro praça com ponto de passagem. E a parte de paisagismo arbóreo está inexistente e o gramado apresenta espécies invasoras.



Figura 41 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral do parque linear: Observa-se um ponto de passagem. E a parte de paisagismo arbóreo está inexistente e o gramado apresenta espécies invasoras.



Figura 42 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral do parque linear: Observa-se a ciclovia com ausência das bordas.

Autor [Assinatura]	Conferido [Assinatura]	Coordenador [Assinatura]	Diretor [Assinatura]
-----------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria
		Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 17/49



Figura 43 a 46 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral do parque linear: Observa-se a ciclovia com ponto de escorregamento causando danos a ciclovia.

Autor	Conferido	Coordenador	Diretor
-------	-----------	-------------	---------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017
		FOLHA: 18/49



Figura 47 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral do parque linear: Observa-se a ciclovia com ponto de interrupção do pavimento de CBUQ de aproximadamente 3 m.



Figura 48 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral do parque linear: Observa-se o ponto de passagem com uma avenida e verifica-se danos ao pavimento assim como um processo erosivo a estrutura.

Autor	Conferido	Coordenador	Diretor
-------	-----------	-------------	---------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017
		FOLHA: 19/49



Figura 49 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral do parque linear: Observa-se o ponto de passagem com uma avenida e verifica-se danos ao pavimento assim como um processo erosivo a estrutura.



Figuras 50 e 51 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral do parque linear: Observa-se o escoamento do talude, presença de ervas daninhas, invasão da vegetação a ciclovia e descontinuidade na ciclovia.

Autor	Conferido	Coordenador	Diretor
-------	-----------	-------------	---------

MTUR	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009	Relatório de Vistoria
SNETur		Nº 018/CGAS/DIETU/2017
DIETU		DATA: 08. AGO. 2017
		FOLHA: 20/49



Figura 52 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral do parque linear: Observa-se o ponto de passagem com uma avenida e verifica-se danos ao pavimento assim como invasão da vegetação a estrutura do ponto de passagem.



Figuras 53 e 54 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral da ponte que faz a transposição dos dois lados da pista de Cooper/ciclovia. A ponte executada com uma estrutura de eucalipto tratado e réguas de madeira como piso se encontra em adequado estado de conservação, entretanto uma das peças do guarda corpo não estava presente.

Autor	Côferido	Coordenador	Diretor
-------	----------	-------------	---------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria
		Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 21/49

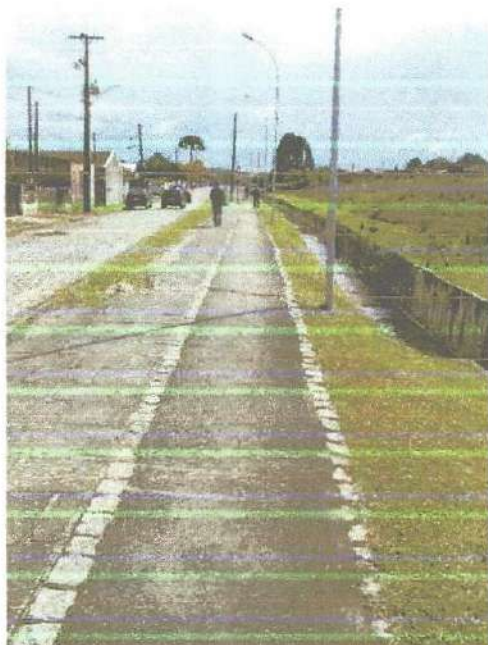


Figura 55 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral da ponte que faz a transposição dos dois lados da pista de Cooper/ciclovía. A ponte executada com uma estrutura de eucalipto tratado e régua de madeira como piso se encontra em adequado estado de conservação, verifica-se desnível entre o piso e o de madeira e a ciclovía.

Autor	Conferido	Coordenador	Diretor
-------	-----------	-------------	---------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria
		Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 22/49



Figuras 56 a 59 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral da pista de Cooper/ciclovía. Detalhes das falhas de implantação do CBUQ em alguns trechos ao longo da obra.

Autor 	Conferido 	Coordenador 	Diretor
-----------	---------------	-----------------	-------------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009	Relatório de Vistoria Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 23/49

RELATÓRIO DE VISTORIA



Figura 60 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral da pista de Cooper/ciclovía. Detalhes da mini praça com bancos em péssimo estado de manutenção e poste não funcional. É possível observar o novo sistema de iluminação com postes fora do padrão do Termo de Referência.



Figuras 61 e 62 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral da pista de Cooper/ciclovía. Detalhes da mini praça com bancos em péssimo estado de conservação e lixeira dentro do padrão do convênio.

Autor	Conferido	Coordenador	Diretor
-------	-----------	-------------	---------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017
		FOLHA: 24/49



Figuras 61 e 62 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral da pista de Cooper/ciclovía. Detalhes da mini praça com postes no padrão do convênio a frente e não funcional e os postes instalados posteriormente no novo padrão adotado.

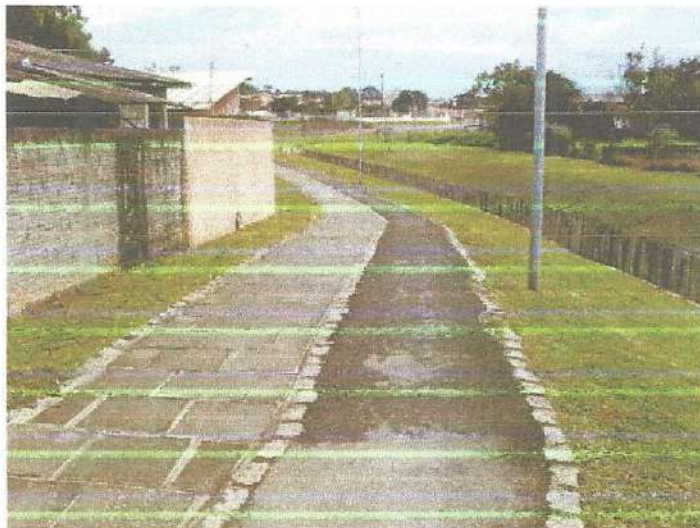


Figuras 63 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral do parque linear: Observa-se o ponto de passagem com uma avenida e verifica-se danos ao pavimento.

Autor	Conferido	Coordenador	Diretor
-------	-----------	-------------	---------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria
		Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 25/49




Figuras 64 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral da pista de Cooper/ciclovía. Observa-se a ciclovía ainda com microfissuras e presença de vegetação sobre o CBUQ. Ao lado pode ser observado o canal.



Figuras 65 e 66 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral da pista de Cooper/ciclovía. Observa-se a ciclovía com microfissuras, descontinuidades e presença de vegetação sobre o CBUQ.

Autor	Conferido	Coordenador	Diretor
			

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017
		FOLHA: 26/49





Figura 67 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral da ação de canalização do curso d'água quer margeia todo o sitio onde a obra se encontra o parque linear. Observa-se o início do trecho canalizado pelo Ministério do Turismo.

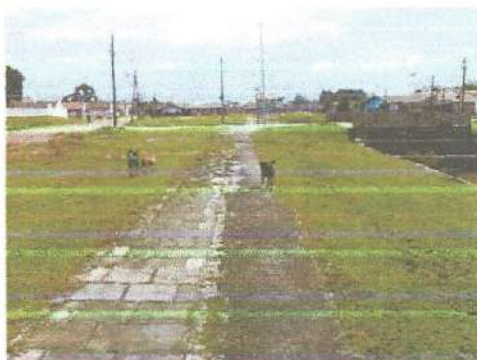


Figura 68 e 69 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Outro ponto da canalização do rio, onde existe o aporte de um afluente e consequente alargamento da calha. Também podemos verificar a presença de pontos de acumulo de material e de vegetação.

Autor 	Conferido 	Coordenador 	Diretor 
--	--	---	--

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017
		FOLHA: 27/49



Figuras 70 e 73 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral do parque linear: Observa-se presença de ervas daninhas, invasão da vegetação a ciclovia e descontinuidade na pista Cooper/ciclovia.



Figura 74 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral do parque linear: Observa-se presença mini praça de passagem verifica-se os postes conforme o escopo do convênio sem finalidade e ao fundo os postes novos postes instalados.

Autor ✓	Conferido PML	Coordenador A	Diretor [Assinatura]
------------	------------------	------------------	-------------------------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria
		Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 28/49



Figura 75 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Outro ponto da canalização do rio, onde podemos verificar a presença de pontos de acumulo de material e de vegetação, com a pista Cooper/ciclovía a margem.



Figura 76 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

O ponto da Figura 75 do canal do Rio, onde podemos verificar a presença de pontos de acumulo de material e de vegetação, cabe observar que neste ponto pode haver comprometimento a eficiência do canal.

Autor	Conferido	Coordenador	Diretor
-------	-----------	-------------	---------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017
		FOLHA: 29/49

Folha
Nº 29
27



Figura 77 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral do parque linear: Observa-se mini praça com o banco de acordo com as características do convênio.



Figura 78 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral do parque linear: Observa-se mini praça com poste dentro das especificações do convênio sem sua lanterna e os outros postes sem a especificações do convênio. Ao fundo pode ser observado o canal com presença de material e vegetação.

Autor	Conferido	Coordenador	Diretor
-------	-----------	-------------	---------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017
		FOLHA: 30/49

Folha
Nº 30
[assinatura]



Figuras 79 a 82 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral do parque linear: Ciclovia com pequenas fissuras e ponto de recalques e mini praça com recalques e presença de vegetação.



Figuras 83 a 84 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral do parque linear: Canal com presença de vegetação e material carregado.

Autor <i>[assinatura]</i>	Conferido <i>[assinatura]</i>	Coordenador <i>[assinatura]</i>	Diretor <i>[assinatura]</i>
------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria
		Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 31/49

Folha
Nº 39





Figuras 85 a 86 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral do parque linear: gramado objeto do convênio com presença de ervas daninhas. Na figura 86 a churrasqueiras ao fundo.



Figuras 87 a 90 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

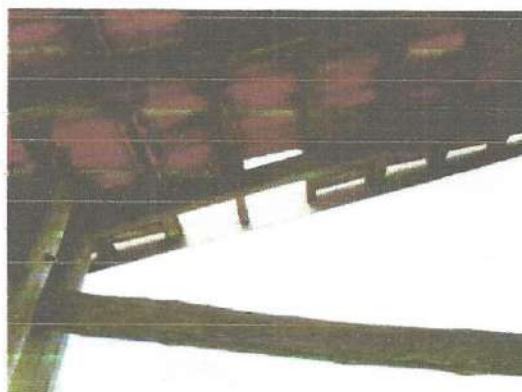
Vista geral do parque linear: CBUQ da ciclovia com interrupção e fissuras, além de presença de vegetação, na figura 90 verificamos o poste no padrão do convênio caído ao chão em sem funcionalidade.

Autor 	Conferido 	Coordenador 	Diretor 
--	--	---	--

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017
		FOLHA: 32/49

Folha
Nº 170
[assinatura]

CHURRASQUEIRAS



Figuras 91 a 96 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral do parque linear: Churrasqueiras com danos causados por uso e também por vandalismo, entretanto funcionais.

Autor <i>[assinatura]</i>	Conferido <i>[assinatura]</i>	Coordenador <i>[assinatura]</i>	Diretor <i>[assinatura]</i>
------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria
		Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 33/49

Folha
Nº 41
②

QUADRAS POLIESPORTIVAS



Figura 97 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral do parque linear: A quadra, observada na figura, apresenta acumulo de água e falta de traves, vegetação em local o qual deveria ser piso.



Figuras 98 a 99 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral do parque linear: A quadra, observada nas figuras, apresenta acumulo de água e falta de traves, vegetação em local o qual deveria ser piso. Com relação as outras quadras verificadas ao fundo temos traves danificadas, ausência de portas, alambrado danificado, ou ausente, aro da tabela de basquetebol danificados, ou ausentes.

Autor	Conferido	Coordenador	Diretor
-------	-----------	-------------	---------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria
		Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 34/49

Folha

Nº 42



Figuras 100 a 103 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral do parque linear: As quadras, observadas nas figuras, apresentam falta das traves, ausência de portas, alambrado danificado, ou ausente, aro da tabela de basquetebol danificados, ou ausentes.

ESTACIONAMENTO



Figura 104 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista de rua de acesso ao parque, onde é possível estacionar os carros dos frequentadores. Pode-se observar pequenas irregularidades no pavimento, como ondulações e sinais de desprendimento de alguns paralelepípedos.

Autor	Conferido	Coordenador	Diretor
-------	-----------	-------------	---------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017
		FOLHA: 35/49

Folha
Nº 43
[assinatura]

BANHEIROS PÚBLICOS E CENTRO ADMINISTRATIVO DO PARQUE



Figura 104 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.
Vista ao fundo do banheiro público e da administração do parque linear, a frente temos o playground e a academia comunitária.

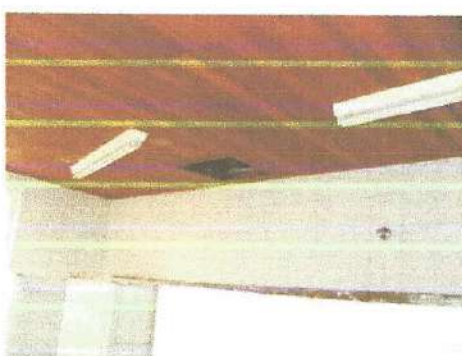
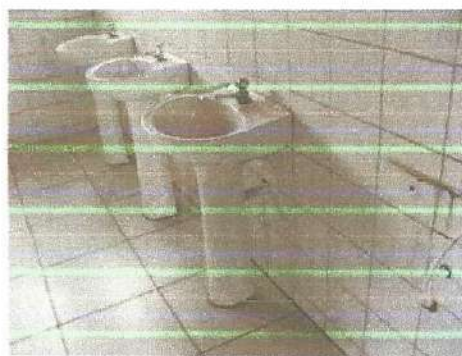


Figuras 105 a 108 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.
Visão geral do banheiro público. O interior apresenta revestimento cerâmico integral nas paredes e no piso. Há presença de vandalismo, mas também de uso (janelas com vidro quebrado).

Autor <i>[assinatura]</i>	Conferido <i>[assinatura]</i>	Coordenador <i>[assinatura]</i>	Diretor <i>[assinatura]</i>
-------------------------------------	---	---	---------------------------------------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria
		Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO, 2017 FOLHA: 36/49

Folha
Nº 44
P



Figuras 109 a 114 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Visão geral do banheiro público. O interior apresenta revestimento cerâmico integral nas paredes e no piso. Sob a cobertura há um forro de madeira. Há presença de vandalismo, mas também de uso (falta de louças e/ou danificadas).

Autor ✓	Conferido PML	Coordenador A	Diretor P
------------	------------------	------------------	--------------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria
		Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 37/49

Folha
Nº 45
[assinatura]



Figura 115 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Detalhe da edificação onde foi instalada a administração do parque, pintura externa executada e a parte interna não foi possível verificar pois a edificação encontrava-se fechada.

PLAYGROUND E ACADEMIA



Figuras 116 - 117 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral da praça de ginástica instalada e do playground a frente dos banheiros públicos e da Administração.

Autor <i>[assinatura]</i>	Conferido <i>[assinatura]</i>	Coordenador <i>[assinatura]</i>	Diretor <i>[assinatura]</i>
------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria
		Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 38/49

Folha
Nº 46

[Handwritten signature]



Figura 118 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral de trecho do parque, com destaque para a pista de Cooper e a ciclovia, que apesar de estarem em mesmo nível possuem tratamentos diferenciados (pista de Cooper em blocos de concreto e ciclovia em asfalto).



Figura 119 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista geral de trecho do parque, com destaque para a ciclovia, que apresenta microfissuras e ao lado da pista podemos verificar um tapume de obra sendo executado por um contrato de repasse entre este Ministério e a prefeitura.

Autor <i>[Handwritten signature]</i>	Conferido <i>[Handwritten signature]</i>	Coordenador <i>[Handwritten signature]</i>	Diretor <i>[Handwritten signature]</i>
---	---	---	---

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria
		Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 39/49

Folha
Nº 047



Figura 120 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa-Paraná.

Vista geral de trecho do parque, com destaque para a ciclovia, com interrupção no pavimento asfáltico.



Figura 121 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa-Paraná.

Detalhes do guarda-corpo executado com peças de eucalipto tratado em autoclave.



Figura 122 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa-Paraná.

Detalhe da pista de coopere e da entrada do parque, que está em reforma, ao fundo temos o estacionamento executado com piso intertravado.

Autor	Conferido	Coordenador	Diretor
-------	-----------	-------------	---------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria
		Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 40/49

Folha
Nº 018
Jr



Figura 123 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.
Visão marginal do lago artificial com mini praça ao fundo.



Figura 124 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.
Visão do lago artificial com forte presença de assoreamento (não é mais um lago).

Autor	Conferido	Coordenador	Diretor
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria
		Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 41/49

Folha
Nº 49
8

FIM DO CANAL E INICIO DO LAGO DE CONTENÇÃO




Figura 125 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Visão do fim do canal e início do lago artificial, presença de material carreado o qual causou o assoreamento do lago artificial.



Figuras 126 a 129 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Visão do lago artificial, presença de material carreado o qual causou o assoreamento do lago artificial e escorregamento de parte da sua margem, recomenda-se retirar o ponto de origem do "Ron off".

Autor 	Conferido 	Coordenador 	Diretor 
--	--	---	--

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017
		FOLHA: 42/49

Folha
Nº 050
[assinatura]



Figuras 130 a 135 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Visão do lago artificial, presença de material carreado o qual causou o assoreamento do lago artificial e escorregamento de parte da sua margem recomenda-se retirar o ponto de origem do Ron off. Também pode ser observado nas figuras 134 e 135 o vertedouro e a barragem de contenção para formação do lago, verifica-se assoreamento até a cota da barragem.

Autor <i>[assinatura]</i>	Conferido <i>[assinatura]</i>	Coordenador <i>[assinatura]</i>	Diretor <i>[assinatura]</i>
------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria
		Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 43/49

Folha
Nº 43/49

VERTEDOIRO



Figura 136 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Visão do lago artificial, a barragem de contenção do lago foi danificada com o objetivo de minimizar o processo de assoreamento.



Figuras 137 a 138 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Visão do vertedouro a jusante do lago, após a pista de rolamento paralela ao parque linear, também se verifica grande quantidade de sedimentos carregados, o que leva a intuir que não está sendo feita devida manutenção do canal

Autor	Conferido	Coordenador	Diretor
-------	-----------	-------------	---------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria
		Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 44/49

Folha
Nº 052

MIRANTE DE CONTENPLAÇÃO



Figura 139 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.
Vista do mirante de contemplação.



Figuras 140 a 143 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista do mirante de contemplação e da praça de acesso, com o sistema de iluminação definido pelo escopo do convênio e seus respectivos bancos.

Autor	Conferido	Coordenador	Diretor
-------	-----------	-------------	---------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria
		Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 45/49

Folha
Nº 053
[assinatura]

ESCORREGAMENTO DO TALUDE



Figuras 140 a 143 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista do mirante de contemplação instalado na beira do lago. No primeiro plano observa-se a incidência de pequenos escorregamentos, que podem assorear ainda mais o lago e danificar a ciclovia como pode ser observado na figura 143.

Autor <i>[assinatura]</i>	Conferido <i>[assinatura]</i>	Coordenador <i>[assinatura]</i>	Diretor <i>[assinatura]</i>
------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria
		Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 46/49

Folha
Nº 054
[Assinatura]



Figuras 144 a 149 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista da pista Cooper/ciclovía envolta do lago artificial. A pista apresenta bom estado de conservação e as mini praças e os equipamentos encontram-se presentes e funcionais neste trecho.

Autor [Assinatura]	Conferido [Assinatura]	Coordenador [Assinatura]	Diretor [Assinatura]
-----------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria
		Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 47/49

Folha
Nº 055
P



Figura 150 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista da pista Cooper/ciclovia envolta do lago artificial. A pista apresenta bom estado de conservação e as minipraças e os equipamentos encontram-se presentes e funcionais neste trecho como pode ser observado ao fundo a minipraça.



Figura 151 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista pórtico de acesso em troncos de eucalipto com 25 cm de diâmetro.

Autor ✓	Conferido PML	Coordenador A	Diretor [Signature]
------------	------------------	------------------	------------------------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 48/49

Folha
Nº 056
[assinatura]



Figura 152 a 155 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista pântico de acesso em troncos de eucalipto com 25 cm de diâmetro. Verifica-se que a iluminação se encontra danificada e o piso apresenta irregularidades (recalques), com presença de vegetação entre os pavimentos.

Autor <i>[assinatura]</i>	Conferido <i>[assinatura]</i>	Coordenador <i>[assinatura]</i>	Diretor <i>[assinatura]</i>
------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 RELATÓRIO DE VISTORIA	Relatório de Vistoria
		Nº 018/CGAS/DIETU/2017
		DATA: 08. AGO. 2017 FOLHA: 49/49

Folha
Nº 057



Figura 156 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista do calçamento e da nova obra sendo executada na entrada do parque.



Figura 157 – Execução de obras de infraestrutura turística na Lapa- Paraná.

Vista da Placa da Obra do Receptivo Turístico do Parque Linear.

Autor	Conferido	Coordenador	Diretor
-------	-----------	-------------	---------



Doc II

Folha
Nº 01**MINISTÉRIO DO TURISMO
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONVÊNIOS**Esplanada dos Ministérios, Bloco U, Sala 217 - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70065-900
Telefone: (61) 2023-7700 - www.turismo.gov.br

Ofício nº 3738/2018/CGCV/DIRAD/GSE

URGENTE E IMPORTANTE**MUNICÍPIO DA LAPA - PR**

Endereço: Praça Mirazinha, nº 87 - Centro Histórico

Cidade/Estado/UF: Lapa/PR

CEP: 83.750-000

C/ Cópia p/

Ao Senhor

PAULO CESAR FIATES FURIATI

Endereço: Rua Senador Souza Naves, nº 1329

Cidade/Estado/UF: Lapa/PR

CEP: 83.750-000

**SECRETARIA DE ADM/PLANEJ.
SECRETARIA DA FAZENDA**

3110118

Paulo Cesar Fiates Furiati
PREFEITO MUNICIPAL

Contatos@Turismo-Gov.br

14/11/18.

Referência: caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 72031.009874/2018-11.

1. Em referência ao Convênio SIAFI/SICONV nº 727325/2009, informamos que a sua prestação de contas teve a análise finalizada e recebeu as seguintes conclusões:

- a) Quanto à realização do objeto (execução física): **APROVADA EM PARTE**, conforme Parecer Técnico nº 030/2018; e,
b) Quanto à regularidade da aplicação financeira: **REJEITADA**, conforme Parecer Financeiro nº 1176/2018.

Assim, em obediência ao art. 76, Parágrafo 4, da Portaria MTur nº 39/2017, comunicamos que, em virtude da rejeição da prestação de contas, o valor transferido em face do convênio deverá ser ressarcido ao erário, em até 10 (dez) dias úteis, devidamente atualizado segundo o Sistema de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União <http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/debito>, conforme demonstrativo em anexo.

3. O recolhimento no valor integral ou o seu parcelamento, nos termos do art. 81 da Portaria MTur nº 39/2017, poderá ser realizado mediante emissão de GRU (Guia de Recolhimento da União) a ser gerada pelo próprio conveniente via sítio da STN/MF (Secretaria do Tesouro nacional do Ministério da Fazenda) https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp, seguindo as orientações do Manual para Devolução de Recursos constante no portal deste Ministério http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/convênio_contratos/convênios_parceria/download_convênios_parcerias/7_-_MANUAL_GRU_2010.pdf.

4. O não recolhimento do débito apurado é motivo de inadimplência do conveniente no CAUC - Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias, dos diversos responsáveis no CADIN - Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, bem como instauração de Tomada de Contas Especial, conforme IN TCU nº 71/2012, alterada pela IN TCU nº 76/2016, Portaria Interministerial nº 424/2016 e Portaria MTur nº 39/2017.

5. No presente momento, o referido convênio encontra-se com a seguinte situação no SIAFI/SICONV: **ADIMPLENTE**.

6. Destaca-se, conforme § 5º, do art. 109, da Lei nº 8.666/93, que os autos do processo se encontram guardados na Coordenação-Geral de Convênio desta pasta, com vista franqueada ao interessado.

Atenciosamente,

Folha
Nº 02

Gestor Financeiro





Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto André, Gestor Financeiro (a)**, em 26/10/2018, às 12:47, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://validacao.turismo.gov.br>, informando o código verificador **0306064** e o código CRC **C7D4FAB2**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 72031.009874/2018-11

SEI nº 0306064

MINISTÉRIO DO TURISMO SECRETARIA NACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO - SNETur DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - DIETU	MINISTÉRIO DO TURISMO EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 PARECER TÉCNICO	
DATA	AUTOR:	
30 de julho de 2018	Roberto de Paula Pinto Engº Agrônomo	 Roberto de Paula Pinto Engenheiro-SIAPE: 1891362 DIETU/SNETur/MTur
		SIAPE: 1891362
N.º DO PARECER TÉCNICO	COORDENADOR-GERAL:	
030/CGAS/DIETU/2018	Alexandre do N. Mangini Engº Civil	 Alexandre do Nascimento Mangini Coordenador-Geral de Acompanhamento e Supervisão de Obras de Infraestrutura Turística
		CREA: 7.457/D - GO
N.º DO ARQUIVO	DIRETOR:	
	Victor Hugo Mosquera	 Victor Hugo Mosquera Diretor de Infraestrutura Turística

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 PARECER TÉCNICO	PARECER TÉCNICO Nº 030/CGAS/DIETU/2018
		DATA: 30-jul-2018 FOLHA: 2/12

Folha
Nº 04

REFERÊNCIA: Prestação de Contas Final.

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Lapa - PR.

ASSUNTO: Prestação de Contas Final Convênio nº. 727325/2009, cujo objeto refere-se à "Execução de Obras de Infraestrutura Turística a fim de qualificar o Circuito Histórico e Ambiental da Lapa-PR".



1. ANTECEDENTES

Trata-se do Convênio nº. 727325/2009, referente à "Execução de Obras de Infraestrutura Turística a fim de qualificar o Circuito Histórico e Ambiental da Lapa-PR", celebrado em 30/12/2009 e publicado no *Diário Oficial da União* – DOU – de 21/01/2010 (fl. 61), com valor inicial total de **R\$ 7.143.000,00** (sete milhões, cento e quarenta e três mil reais), sendo **R\$ 7.000.000,00** (sete milhões de reais) do Concedente e **R\$ 143.000,00** (cento e quarenta e três mil reais) como contrapartida da Conveniente. Por meio do sexto Termo Aditivo ao Convênio em epígrafe, a vigência do Convênio vigorou até 31/12/2012, conforme publicação no D.O.U de 15 de outubro de 2012, seção 3, página 151.

Em 17/06/2010, o Primeiro Termo Aditivo ao Convênio foi celebrado e publicado no DOU em 22/06/2010 (fl. 109) alterando o valor do Convênio para **R\$ 7.978.074,08** (sete milhões, novecentos e setenta e oito mil, setenta e quatro reais e oito centavos), sendo **R\$ 7.818.372,60** (sete milhões, oitocentos e dezoito mil, trezentos e setenta e dois reais e sessenta centavos) da Concedente e **R\$ 159.701,48** (cento e cinquenta e nove mil, setecentos e um reais e quarenta e oito centavos) a título de contrapartida da Conveniente.

O valor da primeira parcela foi liberado em 29/06/2010, por meio da 2010OB800948, no valor de **R\$ 5.000.000,00** (cinco milhões de reais – fl. 127).

Os Segundo e Terceiro Termos Aditivos ao Convênio foram referentes à indicação de crédito e empenho, tendo sido publicados no DOU de 15/09/2010 (fl. 171) e 26/10/2010 (fl. 206), respectivamente.

Autor 	Conferido	Coordenador 	Diretor 
--	-----------	--	--

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 PARECER TÉCNICO	PARECER TÉCNICO Nº 030/CGAS/DIETU/2018
		DATA: 30-jul-2018
		FOLHA: 3/12

Folha
Nº 03

Por intermédio da 2010OB801865, em 30/12/2010, foi liberada a segunda parcela no valor de **R\$ 1.000.000,00** (um milhão de reais – fl. 241) e, em 13/4/2011, foi liberada a terceira parcela no valor de **R\$ 1.000.000,00** (um milhão de reais – fl. 351) por meio da 2011OB800024.



Em decorrência da solicitação de aditivo da Conveniente no valor de **R\$1.838.059,41** (um milhão, oitocentos e trinta e oito mil, cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos) e posterior análise e aprovação da coordenação técnica competente, foi celebrado o Quarto Termo do Convênio nº. 727325/2009 em 18/05/2011 e publicado no DOU em 19/05/2011 (fl. 393).

Assim, o valor do Convênio foi alterado para **R\$ 9.816.133,49** (nove milhões, oitocentos e dezesseis mil, cento e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), sendo **R\$ 9.619.670,82** (nove milhões, seiscentos e dezenove mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e dois centavos) da Concedente e **R\$ 196.462,67** (cento e noventa e seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos) a título de contrapartida da Conveniente.

As Tabelas a seguir mostram a Relação dos empenhos efetuados, Cronograma de desembolso aprovado e a Relação dos Repasses efetuados pelo MTur respectivamente conforme dados obtidos pelo portal de Convênios:

Tabela 1 – Relação dos empenhos efetuados.

Data de Emissão	Número	Valor do Empenho
30/03/2011	2011NE800067	R\$ 1.801.298,22
04/10/2010	2010NE901830	R\$ 818.372,60
02/07/2010	2010NE901644	R\$ 2.000.000,00
29/12/2009	2009NE902538	R\$ 5.000.000,00
Total		R\$ 9.619.670,82

Autor 	Conferido	Coordenador 	Diretor 
--	-----------	---	--

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 PARECER TÉCNICO	PARECER TÉCNICO Nº 030/CGAS/DIETU/2018
		DATA: 30-jul-2018
		FOLHA: 4/12

Tabela 2 – Cronograma de desembolso aprovado.

Número da Parcela	Tipo I	Mês	Ano	Valor (R\$)
1	CONCEDENTE	Dezembro	2009	R\$ 5.000.000,00
2	CONCEDENTE	Agosto	2010	R\$ 1.000.000,00
3	CONCEDENTE	Novembro	2010	R\$ 1.000.000,00
4	CONCEDENTE	Dezembro	2010	R\$ 818.372,60
5	CONCEDENTE	Junho	2011	R\$ 1.801.298,22
6	CONVENIENTE	Dezembro	2009	R\$ 28.600,00
7	CONVENIENTE	Abril	2010	R\$ 114.400,00
8	CONVENIENTE	Dezembro	2010	R\$ 16.701,48
9	CONVENIENTE	Junho	2011	R\$ 36.761,19
Total				R\$ 9.816.133,49

Folha
Nº 06
J

Tabela 3 – Relação dos Repasses efetuados pelo MTur.

Data de Emissão	Número Siasi	Valor
29/06/2010	201008800948	R\$ 5.000.000,00
30/12/2010	201008801865	R\$ 1.000.000,00
13/04/2011	201108800024	R\$ 1.000.000,00
11/07/2011	201108800407	R\$ 818.372,60
26/12/2011	201108800498	R\$ 1.801.298,22
Total		R\$ 9.619.670,82




2. ANÁLISE

2.1. ANÁLISE DOCUMENTAL

Tabela 04 – Informações da Contrapartida expostas no SICONV.

Data	Tipo de Documento	Valor R\$
01/12/2010	TED Transf.eletrôn.Disponível	16.701,48
30/05/2011	TED Transf.eletrôn. Disponível	36.761,19
25/06/2010	Crédito Autorizado	143.000,00
Total		196.462,67

Fonte: SICONV

Autor 	Conferido	Coordenador 	Director 
--	-----------	--	---

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 PARECER TÉCNICO	PARECER TÉCNICO
		Nº 030/CGAS/DIETU/2018
		DATA: 30-jul-2018 FOLHA: 5/12

Folha
Nº 07

Cabe observar que o valor de R\$ 53.462,67 (cinquenta e três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos) é a soma de R\$ 16.701,48 (dezesseis mil, setecentos e um reais e quarenta e oito centavos) e R\$ 36.761,19 (trinta e seis mil, setecentos e sessenta e um reais e dezenove centavos), que consta na **tabela 2** como sendo contrapartida, entretanto, condiz à rendimentos financeiros, conforme verificado na ABA de Rendimento e aplicação no SICONV.



Através do Portal de Convênios (SICONV) foi encaminhada a prestação de contas do Convênio nº 727325/2009, apresentada em conformidade com a Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008 nas ABAs:

- Relatório de Cumprimento do Objeto;
- Declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento;
- Saldo remanescente;
- A relação dos serviços prestados, quando for o caso;
- Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver;
- Termo de compromisso por meio do qual o conveniente ou contratado será obrigado a manter os documentos relacionados ao convênio ou contrato de repasse, nos termos do § 3º do art. 3º;
- Relatórios;
- Anexos e
- Publicações.

As ABAs no SICONV preenchidas são:

- Declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento; e
- Termo de compromisso por meio do qual o Conveniente ou Contratado será obrigado a manter os documentos relacionados ao Convênio ou Contrato de Repasse, nos termos do § 3º do art. 3º.

Com relação a prestação de contas ainda é importante destacar que o saldo remanescente não foi devolvido e nem o proporcional do rendimento e, também não foram anexados os documentos

Autor 	Conferido	Coordenador 	Diretor 
--	-----------	--	--

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 PARECER TÉCNICO	PARECER TÉCNICO Nº 030/CGAS/DIETU/2018
		DATA: 30-jul-2018 FOLHA: 6/12

Folha
Nº 6/12

referentes à prestação de contas, como exemplo: os extratos, contratos, publicações como preconiza a legislação, ou seja, as ABAs pendentes são:

- Saldo remanescente;
- Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver;
- Relatório de Cumprimento do Objeto;
- Anexos, e
- Publicações.

É importante destacar, que os anexos e as publicações não apresentam todos os documentos necessários como preconiza a legislação citada anteriormente, como por exemplo: a ausência das notas fiscais, as publicações, atesté de recebimento da obra, contratos, entre outros.

Com relação à execução física, é importante salientar que a obra foi objeto de vistorias técnicas, conforme tabela abaixo:

Tabela 5 – Vistorias Técnicas executadas no Convênio nº 727325/2009.


Nº Relatório de Vistoria de Obra	Data da Vistoria	Observação
092/2010	04/11/2010	Fl. 213 – 224
006/2011	03/02/2011	Fl. 284 – 299
022/2011	05/05/2011	Fl. 432 – 449
057/2011	27/10/2011	Fl. 535 – 563
031/2012	27/10/2011	Fl. 736 – 784
018/2017	26/04/2017	Fl. 898 – 952

É importante salientar também, que a última vistoria – Relatório de Vistoria Técnica nº 018/2017 de 26 de abril de 2017 (fls. 898 – 952) – foi realizada com a obra finalizada no intuito de dirimir dúvidas sobre a execução do Convênio, não sanadas pela vistoria anterior, ou seja, para efeitos da análise, considera-se como a vistoria final.

Contudo é importante enfatizar no relatório de vistoria supracitado as seguintes constatações sobre a obra, in verbis:

V. CONCLUSÃO

Com base no conteúdo ora versado, obtém-se as seguintes conclusões:

Autor 	Conferido	Coordenador 	Diretor 
--	-----------	--	--

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 PARECER TÉCNICO	PARECER TÉCNICO Nº 030/CGAS/DIETU/2018
		DATA: 30-jul-2018 FOLHA: 7/12

Folha
Nº 09

1. Pode-se afirmar que as etapas executadas guardam consonância com o convênio, de forma que não foram observados, nesta ocasião, danos ou irregularidades a ponto de comprometer o cumprimento do objeto conveniado. No entanto, reitera-se que a Conveniente se atente para a questão das ações de vandalismo que cercam a obra, a fim de coibir estas ações visando uma melhor conservação dos equipamentos construídos.
2. A execução física perfaz, conforme observado, a quase totalidade dos serviços preconizados, alcançando índices em torno de 100%.
3. Está vistoria é a final e apresentou algumas divergências de serviços conforme relatado ao longo deste relatório os quais serão mensurados no Parecer final de Prestação de Contas.
4. Recomenda-se notificar a Conveniente acerca das considerações deste relatório.



Faz-se anexar relatório fotográfico.

2.2. ANÁLISE (Prestação de Contas Final/ Obra).

A análise da prestação de contas levou em consideração as medições apresentadas, as vistorias executadas e o plano de trabalho aprovado, cabe observar, que nas medições encaminhadas existem serviços com quantitativos divergentes do aprovado e serviços executados em desacordo com o plano de trabalho, conforme apresentado na tabela anexa a este Parecer.

Foram identificados itens que não atenderam às expectativas dos projetos aprovados e/ou não foram executados, que serão glosados conforme descrito abaixo:

- a) Poste em aço reforçado padrão Republicano com 01 luminária em policarbonato em desacordo com o projeto, valor já glosado pela Conveniente;
- b) Banco de Praça padrão - pés em ferro fundido 5 tábuas de imbuia em desacordo com o projeto, valor já glosado pelo Conveniente faltantes ou em desacordo com o projeto, valor já glosado pela Conveniente;
- c) Transporte de equipamentos pesados, ferramentas, equipamentos de escritório, de refeitório e de alojamento deveria custar R\$ 163.534,00 (cento e sessenta e três mil, quinhentos e trinta e quatro reais), entretanto foi realizado por R\$ 184.233,00 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e trinta e três reais), ou seja, gerando uma glosa de R\$ 20.699,00 (vinte e mil, seiscentos e noventa e nove reais);

Autor 	Conferido	Coordenador 	Diretor 
--	-----------	---	--

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 PARECER TÉCNICO	PARECER TÉCNICO
		Nº 030/CGAS/DIETU/2018
		DATA: 30-jul-2018 FOLHA: 8/12

Folha
Nº 08

- d) Foi identificado uma discrepância entre as notas fiscais e o valor medido de R\$ 42.126,43 (quarenta e dois mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos);


Tabela 6 – Valores apresentados pela Conveniente.

Documentos	Valores
Notas fiscais	R\$ 9.816.068,88
Medições 1 -13	R\$ 9.773.942,45
Diferença	R\$ 42.126,43

- e) Portanto a soma dos serviços divergentes ou não executados apresentado pela Conveniente foi de R\$ 200.914,84 (duzentos mil, novecentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos).
- f) Serviços se quer medidos pela Conveniente somam conforme item "d" R\$ 42.126,43 (quarenta e dois mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos) e os serviços executados em desacordo, ou não executados conforme o item "e" somam R\$ 243.041,27 (duzentos e quarenta e três mil, quarenta e um reais e vinte e sete centavos). Cabe observar, que o valores dos itens "a", "b" e "c", já estão contabilizados no item "e".

Contudo, verificou-se, que os serviços executados em desacordo e os não aprovados totalizam R\$ 243.041,27 (duzentos e quarenta e três mil, quarenta e um reais e vinte e sete centavos) de glosa, conforme destacado na tabela anexa.

A prestação de contas apresentada pela Conveniente totaliza R\$ 9.773.942,45 (nove milhões, setecentos e setenta e três mil, novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) conforme boletins de medição (tabela anexa). Entretanto, a Tabela 6 - Relação das Notas fiscais soma R\$ 9.816.068,88 (nove milhões, oitocentos e dezesseis mil, sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), gerando assim uma diferença de R\$ 42.126,43 (quarenta e dois mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos), os quais deverão ser glosados pois não existe comprovação de execução.

Autor 	Conferido	Coordenador 	Diretor 
--	-----------	---	--



MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 PARECER TÉCNICO	PARECER TÉCNICO Nº 030/CGAS/DIETU/2018
		DATA: 30-jul-2018 FOLHA: 9/12

Folha
Nº 011

Tabela 07 – Relação de Notas Fiscais constantes no SICONV.

Data Emissão	Nº	Tipo	Razão Social	Valor Original (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Tributos (R\$)
30/10/2012	741	NOTA FISCAL	EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SAN E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	60.912,65	60.912,65	4.233,43
29/07/2012	325	NOTA FISCAL	EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SAN E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	-	300.864,53	20.910,08
29/06/2011	289	NOTA FISCAL	EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SAN E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1.386.727,90	1.386.727,90	96.377,59
27/05/2011	262	NOTA FISCAL	EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SAN E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1.020.737,12	1.020.737,12	70.941,23
28/04/2011	226	NOTA FISCAL	EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SAN E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1.030.870,91	1.030.870,91	71.645,53
30/03/2011	209	NOTA FISCAL	EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SAN E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	440.598,37	440.598,37	30.621,59
24/02/2011	181	NOTA FISCAL	EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SAN E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	73.991,66	73.991,66	4.328,51
28/01/2011	171	NOTA FISCAL	EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SAN E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	88.834,83	88.834,83	6.174,02
23/12/2010	147	NOTA FISCAL	EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SAN E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	951.779,51	951.779,51	66.148,68
29/11/2010	129	NOTA FISCAL	EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SAN E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1.520.159,28	1.520.159,28	105.651,07
29/10/2010	99	NOTA FISCAL	EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SAN E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	821.567,59	821.567,59	57.098,95
29/09/2010	72	NOTA FISCAL	EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SAN E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	161.094,95	161.094,95	9.424,06
29/09/2010	71	NOTA FISCAL	EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SAN E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	949.204,25	949.204,25	65.969,69
27/08/2010	46	NOTA FISCAL	EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SAN E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	587.866,11	587.866,11	39.951,27
10/08/2010	29	NOTA FISCAL	EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SAN E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	407.132,92	407.132,92	23.223,00
25/06/2010	5477	NOTA FISCAL	EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SAN E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	13.726,30	13.726,30	606,12
Total				9.515.204,35	9.816.068,88	673.304,82

Fonte: SICONV.

Autor 	Conferido	Coordenador 	Diretor 
--	-----------	---	--

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 PARECER TÉCNICO	PARECER TÉCNICO Nº 030/CGAS/DIETU/2018
		DATA: 30-jul-2018
		FOLHA: 10/12

*Folha
Nº 012*

É importante destacar que na ABA do SICONV para inclusão das notas fiscais, não foram inseridos os documentos fiscais pela Conveniente, somente documentos de pagamentos das taxas referentes as notas conforme a tabela 7. Porém, existem notas inseridas na ABA de PROJETO BÁSICO / TERMO DE REFERÊNCIA do SICONV.

Na ABA do SICONV de Saldo Remanescente não consta a devolução, apesar de existir na ABA Rendimentos o valor de R\$ 148.339,58 (cento e quarenta e oito mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos), sendo que, autorizou-se pelo Parecer Técnico Nº. 192/2012/CGPR-I/ DPRDT/SNPDT/MTur de 19/09/2012, a utilização no Convênio do valor de R\$ 142.382,08 (cento e quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e oito centavos) e, ainda restou um saldo de R\$5.957,50 (cinco mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).

Portanto, verificou-se que os serviços executados em desacordo, ou não executados somam R\$ 243.041,27 (duzentos e quarenta e três mil, quarenta e um reais e vinte e sete centavos).



Cabe observar, que os boletins de medição não foram apresentados a este Ministério e sim planilhas consolidadas se referindo aos boletins de medição.

Verifica-se, que deverá ser observada a proporcionalidade quando da devolução dos recursos, conforme tabela abaixo:

a) Glosa total:	R\$ 243.041,27
b) Glosa proporcional:	R\$ 238.180,44
c) Valor a restituir do saldo do Convênio:	R\$ 5.957,50
d) Valor proporcional a devolver do saldo do convênio	R\$ 5.838,27
e) Total dos valores proporcionais a devolver:	R\$ 244.018,71

Também é importante destacar a ausência das ARTs de execução da obra, de fiscalização e da empresa executora da obra, o que contraria o disposto na Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977.

A Licença Prévia foi emitida com o número 23533 e Protocolo nº 77685138 na data de 10/04/2010, além de constar no SICONV, na ABA de PROJETO BÁSICO / TERMO DE

Autor 	Conferido	Coordenador 	Diretor 
--	-----------	---	--

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 PARECER TÉCNICO	PARECER TÉCNICO Nº 030/CGAS/DIETU/2018
		DATA: 30-jul-2018 FOLHA: 11/12

Folha
Nº 013
B

REFERÊNCIA. Entretanto, visto que a obra teve início e fim, ainda ficaram pendentes a Licença de Instalação e a Licença de Operação.

Em relação à Titularidade, constatou-se vários Mandados de Imissão de Posse e Citações de desapropriação na área do respectivo projeto no SICONV, na ABA de PROJETO BÁSICO / TERMO DE REFERÊNCIA.


3. CONCLUSÃO

Trata-se da Prestação de Contas Final do Convênio nº. 727225/2009, parte técnica, referente à Execução de Obras de Infraestrutura Turística a fim de qualificar o Circuito Histórico e Ambiental da Lapa-PR.

Na apuração da documentação encaminhada na Prestação de Contas e a constante do processo, verificou-se a execução do objeto conveniado com funcionalidade, entretanto com algumas alterações em relação ao projeto aprovado.

Ademais, cabe destacar que a Conveniente apresentou notas fiscais que totalizam despesas no valor de R\$ 9.816.068,88 (nove milhões, oitocentos e dezesseis mil, sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), porém os boletins de medição também apresentados na prestação de contas totalizam R\$ 9.773.942,45 (nove milhões, setecentos e setenta e três mil, novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), gerando uma diferença entre os boletins de medição e as notas fiscais de R\$ 42.126,43 (quarenta e dois mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e três centavos).

Verificou-se, também, que a soma das discrepâncias apuradas pelo próprio Conveniente, ou seja, dos serviços realizados com divergência de quantitativos e/ou em desacordo com o plano de trabalho somam o valor de R\$ 200.914,84 (duzentos mil, novecentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos) que somados com a diferença citada anteriormente totalizam R\$ 243.041,27 (duzentos e quarenta e três mil, quarenta e um reais e vinte e sete centavos). Constatou-se, também, a diferença de rendimentos não devolvidos a este Ministério no valor de R\$ 5.957,50 (cinco mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), que totalizam uma glosa de R\$ 248.998,77 (duzentos e quarenta oito mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos) que deverão ser restituídos à União na seguinte proporção, observando a legislação:

Autor 	Conferido	Coordenador 	Diretor 
--	-----------	--	--

MTUR SNETur DIETU	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA A FIM DE QUALIFICAR O CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA-PR CONVÊNIO Nº 727325/2009 PARECER TÉCNICO	PARECER TÉCNICO
		Nº 030/CGAS/DIETU/2018
		DATA: 30-jul-2018 FOLHA: 12/12



Folha
Nº 12/12


- Da restituição dos rendimentos: R\$ 5.838,27 (cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos).
- Da glosa: R\$ 238.180,44 (duzentos e trinta e oito mil, cento e oitenta reais quarenta e quatro centavos).
- Totalizando um valor proporcional referente ao repasse MTur de R\$ 244.018,71 (duzentos e quarenta e quatro mil, dezoito reais e setenta e um centavos).

Na análise documental da prestação de contas, quanto ao licenciamento ambiental, só consta a licença Prévia (SICONV) e, quanto à titularidade constam apenas Mandados de Imissão de Posse e Citações de desapropriação da área do respectivo projeto, em desconformidade com a Portaria Interministerial no 127, de 29 de maio de 2008 no seu Art. 25, alínea b, § 2º.

O conteúdo ora versado não exclui a necessidade da análise financeira e/ou jurídica pelos setores competentes deste Ministério.

✓

Autor 	Conferido	Coordenador 	Diretor 
--	-----------	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

ESTADO DO PARANÁ

Alameda David Carneiro, 243 - Centro

CEP 83750-000 - (41) 3547-8000

www.lapa.pr.gov.br

III

Folha
Nº 01

01

Ofício nº 339/2018/GAB

Lapa, 08 de novembro de 2018.

Ao Ilustríssimo Senhor

PAULO ROBERTO ANDRÉ

Gestor Financeiro/Coordenação Geral de Convênios

Ministério do Turismo

Esplanada dos Ministérios, Bloco U, 2º andar, Sala 2017 – Bairro Zona Cívico-Administrativa

CEP: 70.065-900

Brasília - DF

Assunto: Complementação da Prestação de Contas do Convênio nº 727.325/2009

Referente: Processo nº 72031.009874/2018/11


Prezado Senhor:

Tem o presente a finalidade de complementar o Ofício nº 329/2018/GAB de 07/11/2018 e esclarecer o item 2.2 a), b) e c) do Parecer Técnico nº 030/CGAS/DIETU/2018 conforme segue:

- 1 Desconsiderar o Complemento da Justificativa a respeito da divergência no valor constante da planilha/orçamento da empresa contratada em relação ao valor da contratação realizada anexada no SICONV em 07/11/2018. Após um levantamento mais detalhado verificou-se que a planilha que consta na aba processo de execução no valor de R\$ 7.935.936,08 está correta, ela se refere aos serviços contratados no âmbito do Convênio nº 727.325/2009, porém a diferença de valor é referente a serviços aditivados. Cabe esclarecer que a planilha de orçamento que consta no processo de licitação CP 06/2010 no valor de R\$ 12.527.936,08, anexada na complementação da prestação de contas em 07/11/2018, contempla os serviços previstos no Convênio nº 727.325/2009 mais os serviços de canalização do córrego do Parque Linear no valor de R\$ 4.592.000,00, objeto do Convênio nº 731421/2009 junto ao Ministério da Integração Nacional.
- 2 Quanto à análise feita na obra, temos as seguintes considerações:
 - i) A inauguração da obra estava prevista para 30/06/2012, nesta época os postes, fiação elétrica e bancos, estavam instalados em conformidade com o projeto aprovado, porém houve depredações enquanto a obra estava em andamento, dessa forma o Município reforçou a vigilância no local.

ENCAMINHADO SEDESY em 12/11/18

Secretaria de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte
Divisão de Convênios e Contratos de Repasse
Rua Nossa Senhora de Fátima, 563 – Estação – CEP: 83.750-000
Fone: (41) 3547-8057



PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

ESTADO DO PARANÁ

Alameda David Carneiro, 243 - Centro

CEP 83750-000 - (41) 3547-8000

www.lapa.pr.gov.br

02

Folha
Nº 02

- ii) No entanto, houve sobras de recursos no valor de R\$ 142.382,08, sendo que a utilização desse valor foi autorizada para a ampliação de meta física, conforme comprovação anexada na prestação de contas em 07/11/2018. Dessa forma as obras foram executadas até dezembro de 2012;
- iii) Em agosto de 2012 os técnicos do Ministério do Turismo realizaram visita técnica na obra e sugeriram que o Município aceitasse o recebimento parcial dos serviços da obra devido às depredações, porém não foi aceito porque essa é era uma responsabilidade da empresa;
- iv) No período de julho a dezembro de 2012 as correções necessárias foram realizadas na obra, inclusive os postes e bancos entregues conforme projeto aprovado, podendo ser confirmado pelo Relatório Fotográfico de 27/10/2012 em anexo, quando a obra já estava 90% concluída;
- v) Em dezembro de 2012 a obra foi inaugurada com todos os itens previstos conclusos e em perfeito estado;
- vi) O termo de caução (garantia) do contrato de empreitada com vigência renovada de 31/12/2012 a 30/05/2013 não foi executado, comprovando dessa forma que não havia pendências na obra;
- vii) O Município na ocasião da transição de governo alertou à nova gestão quanto à necessidade de manutenção permanente da obra, o que infelizmente não foi feita. Além disso, o vandalismo ajudou a deteriorar os equipamentos urbanos;
- viii) Em 26/04/2017 foi feita uma inspeção técnica na obra que resultou no Relatório de Vistoria nº 018/CGAS/DIETU/2017, o qual apontou que houve alteração nos postes e instalações elétricas. Essas alterações foram promovidas, com recursos próprios, pela gestão 2013-2016, visando resolver o problema das depredações;
- ix) A manutenção do Parque foi retomada a partir da inspeção técnica feita pelo Ministério em 2017, conforme pode ser comprovado pelas fotos que seguem em anexo, referentes à recuperação do lago.

Atenciosamente,

Denis Magalhães Coelho
Chefe da Divisão de Convênios e Contratos de Repasse

Paulo Cesar Fiates Furiati
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

ESTADO DO PARANÁ

Alameda David Carneiro, 243 - Centro

CEP 83750-000 - (41) 3547-8000

www.lapa.pr.gov.br

01

Folha
Nº 03

Relatório Convênio nº 727325/2009/MTUR

Objeto: Execução de Obras de Infraestrutura Turística a fim de qualificar o Circuito Histórico e Ambiental da Lapa.

Assinatura do Convênio: 30/12/2009.

Final da vigência: 31/12/2012.

Prestação de Contas enviada ao Ministério: 01/02/2013.

Valores utilizados: R\$ 9.619.606,21 + 196.462,67 contrapartida = R\$ 9.816.068,88

Considerações a respeito do Parecer Técnico emitido pelo Ministério após a vistoria técnica de 26/04/2017:

- 1 Após um levantamento mais detalhado verificou-se que a planilha que consta na aba processo de execução no valor de R\$ 7.935.936,08 está correta, ela se refere aos serviços contratados no âmbito do Convênio nº 727.325/2009, porém a diferença de valor é referente a serviços aditivados. Cabe esclarecer que a planilha de orçamento que consta no processo de licitação CP 06/2010 no valor de R\$ 12.527.936,08, anexada na complementação da prestação de contas em 07/11/2018, contempla os serviços previstos no Convênio nº 727.325/2009 mais os serviços de canalização do córrego do Parque Linear no valor de R\$ 4.592.000,00, objeto do Convênio nº 731421/2009 junto ao Ministério da Integração Nacional.
- 2 Quanto à análise feita na obra, temos as seguintes considerações:
 - i) A inauguração da obra estava prevista para 30/06/2012, nesta época os postes, fiação elétrica e bancos, estavam instalados em conformidade com o projeto aprovado, porém houve depredações enquanto a obra estava em andamento, dessa forma o Município reforçou a vigilância no local;
 - ii) No entanto, houve sobras de recursos no valor de R\$ 142.382,08, sendo que a utilização desse valor foi autorizada para a ampliação de meta física, conforme comprovação anexada na prestação de contas em 07/11/2018. Dessa forma as obras foram executadas até dezembro de 2012;
 - iii) Em agosto de 2012 os técnicos do Ministério do Turismo realizaram visita técnica na obra e sugeriram que o Município aceitasse o recebimento parcial dos serviços da obra devido às depredações, porém não foi aceito porque essa é uma responsabilidade da empresa;
 - iv) No período de julho a dezembro de 2012 as correções necessárias foram realizadas na obra, inclusive os postes e bancos entregues conforme projeto aprovado, o que foi confirmado pelo envio de Relatório Fotográfico de 27/10/2012, quando a obra já estava 90% concluída;
 - v) Em dezembro de 2012 a obra foi inaugurada com todos os itens previstos conclusos e em perfeito estado;



PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA


ESTADO DO PARANÁ

Alameda David Carneiro, 243 - Centro
CEP 83750-000 - (41) 3547-8000
www.lapa.pr.gov.br

- vi) O termo de caução (garantia) do contrato de empreitada com vigência renovada de 31/12/2012 a 30/05/2013 não foi executado, comprovando dessa forma que não havia pendências na obra;
- vii) O Município na ocasião da transição de governo alertou à nova gestão quanto à necessidade de manutenção permanente da obra, o que infelizmente não foi feita. Além disso, o vandalismo ajudou a deteriorar os equipamentos urbanos;
- viii) Em 26/04/2017 foi feita uma inspeção técnica na obra que resultou no Relatório de Vistoria nº 018/CGAS/DIETU/2017, o qual apontou que houve alteração nos postes e instalações elétricas. Essas alterações foram promovidas, com recursos próprios, pela gestão 2013-2016, visando resolver o problema das depredações;
- ix) A manutenção do Parque foi retomada a partir da inspeção técnica feita pelo Ministério em 2017, fotos foram enviadas ao Ministério, referentes à recuperação do lago.;
- x) O Ministério afirma que as etapas executadas guardam consonância com o Convênio, de forma que não foram observadas irregularidades a ponto de comprometer o cumprimento do objeto;
- xi) A execução física alcançou índices em torno de 100%;
- xii) As divergências levantadas foram a respeito do que foi levantado no sub item i), serviços estes que foram modificados ou estavam ausentes na ocasião da vistoria);
- xiii) Tendo em vista que a prestação de contas foi enviada em 01/02/2013 e houve um pagamento feito em 19/03/2013, mesmo que autorizado pelo Ministério, não foi computado na análise da prestação de contas e faz parte do valor glosado;
- xiv) Mesmo após envio dos comprovantes ao Ministério, a decisão foi manter a glosa, restando ao Município efetuar o parcelamento e pagamento à União para fins de manter a adimplência e não prejudicar os demais repasses de recursos federais.

Atenciosamente,

Denis Magalhães Coelho
Chefe da Divisão de Convênios e Contratos de Repasse



PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA | PARANÁ
CNPJ - 76.020.452/0001-05
PRAÇA MIRAZINHA BRAGA 87 - CENTRO
CEP 83750-000 - (41) 3547-8000
www.lapa.pr.gov.br

Folha
Nº 01
de 01

DOC IV

TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVO DE OBRA

Convênio nº: 727325/2009

Declaramos aceitar em caráter Definitivo a obra executada, abaixo discriminada, estando tudo conforme as especificações exigidas e de acordo com o Plano de Trabalho, previamente aprovado pelo Ministério do Turismo.

Obra/serviço realizado: Execução de Obras de Infraestrutura Turística a fim de qualificar o Circuito Histórico e Ambiental da Lapa-PR.

Endereço da Obra: Trecho entre a Rua Barão dos Campos Gerais até a Av. Caetano Munhoz da Rocha, Praça da Bica do Pote e Parque dos Neves.

Licitação: Concorrência Pública nº 006/2010 – Tipo de Licitação: Menor Preço.

Valor: R\$ 9.958.515,37 (nove milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e quinze reais e trinta e sete centavos).

Empresa prestadora do Serviço: EMPO – Empresa Curitibana de Saneamento e Construção Civil Ltda.

CNPJ: 76.024.876/0001-30

Nº do Contrato: 179/10

Vigência do Contrato/Aditivos: 31/03/2013

Na oportunidade assumimos a responsabilidade pelo pleno funcionamento das atividades relacionadas com a obra, sendo garantidas as especificações ou exigências de qualidade requeridas.

O presente termo não prejudica o direito de regresso da instância recebedora das obras, quando apuradas ulteriores responsabilidades do executor, conforme Art. 69 da Lei nº 8666/93, e o Art. 618 do Código Civil Brasileiro.

Lapa-PR., 15 de Abril de 2013.


Antonio Carlos Pasdiora
Engenheiro Civil CREA-PR 10.633/D
Prefeitura Municipal da Lapa

Alberto Guedes Pereira
Engenheiro Civil CREA-PR 16.632/D
EMPO – Empresa Curitibana de Saneamento
e Construção Civil Ltda

Celso
Secretário de Infraestrutura, Obras Públicas
e Transporte

Leila Aubrift Klenk
Prefeita Municipal da Lapa

Assinado
Diretor
Ambiental
Assimilados



**PREFEITURA
MUNICIPAL DA LAPA**

DOC V
PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA | PARANÁ
CNPJ - 76.020.452/0001-05
PRAÇA MIRAZINHA BRAGA 87 - CENTRO
CEP 83750-000 - (41) 3547-8000
www.lapa.pr.gov.br

Folha
Nº 001

Lapa, 02 de abril de 2014.

C.I. nº 212 – Secretaria de Infraestrutura, Obras Públicas e Transporte

**Ao
Departamento de Planejamento e Convênios**

Prezado Denis,


Analizando a documentação relativa à construção do Parque Linear constatamos que no Termo de Recebimento Provisório elaborado pela Sra. Ana Murbach Bortolanza em dezembro de 2012, o valor constante é apenas o dos Recursos do Ministério do Turismo não constando o valor financeiro que veio do Ministério da Integração Nacional.

No meu modesto entender temos que ter um recebimento provisório da parte que corresponde à Integração Nacional; Evidentemente que o mesmo deve ocorrer com os recebimentos definitivos.

No caso do Ministério do Turismo o Diretor de Saneamento Ambiental, Anderson Teixeira, está tratando junto à Empresa a recuperação do talude do lago e quando o serviço estiver concluído ele emite o Termo Definitivo. No caso da Integração não há restrição alguma para que, acredito ter que ser a Ana Murbach, se emita o Termo Definitivo.

Apenas estamos fazendo esse alerta, pois à época da construção a gestora do contrato era a Ana e como técnicos dos Ministérios do Turismo e Integração Nacional fizeram as vistorias finais em janeiro/13 e fevereiro/13 respectivamente sem detectar problemas na obra, portanto era de bom senso que esses Termos sejam emitidos uma vez que até a prestação de contas já foi feita.

Atenciosamente,


Antônio Carlos Pasdiora
Engº Civil – CREA 10.633-D-PR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTE
Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 563 – Bairro Estação – Lapa / PR
CEP 83750-000 - (41) 3911-1104

Recebido em
04/04/14
Denis



TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVO DE OBRA

Convênio nº: 731421/2009

Declaramos aceitar em caráter Definitivo a obra executada, abaixo discriminada, estando tudo conforme as especificações exigidas e de acordo com o Plano de Trabalho, previamente aprovado pelo Ministério da Integração Nacional.

Obra/serviço realizado: Obras de canalização do Córrego Passo dos Neves no Parque Linear do Passo dos Neves.

Endereço da Obra: Parque Linear Passo dos Neves, imediações com Avenida Aloisio Leoni.

Licitação: Concorrência Pública nº 006/2010 – Tipo de Licitação: Menor Preço.

Valor: R\$ 4.592.000,00 (quatro milhões, quinhentos e noventa e dois mil reais).

Empresa prestadora do Serviço: EMPO – Empresa Curitibana de Saneamento e Construção Civil Ltda.

CNPJ: 76.024.876/0001-30

Nº do Contrato: 179/10

Vigência do Contrato/Aditivos: 31/03/2013

Na oportunidade assumimos a responsabilidade pelo pleno funcionamento das atividades relacionadas com a obra, sendo garantidas as especificações ou exigências de qualidade requeridas.

O presente termo não prejudica o direito de regresso da instância recebedora das obras, quando apuradas ulteriores responsabilidades do executor, conforme Art. 69 da Lei nº 8666/93, e o Art. 618 do Código Civil Brasileiro.

Lapa-PR., 15 de Abril de 2013.

Antonio Carlos Pasdiora
Engenheiro Civil CREA-PR 10.633/D
Prefeitura Municipal da Lapa

Alberto Guedes Pereira
Engenheiro Civil CREA-PR 16.632/D
EMPO – Empresa Curitibana de Saneamento
e Construção Civil Ltda

Celso
Secretário de Infraestrutura, Obras Públicas
e Transporte

Leila Aubrift Klenk
Prefeita Municipal da Lapa

*Anderson
Diretor de Saneamento
Permitiu Assinatura*



**PREFEITURA
MUNICIPAL DA LAPA**

DOC VII

PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA | PARANÁ
CNPJ - 76.020.452/0001-05
PRAÇA MIRAZINHA BRAGA 87 - CENTRO
CEP 83750-000 - (41) 3547-8000
www.lapa.pr.gov.br

**Folha
Nº 001**

Lapa/PR, 08 de julho de 2015.

C I N° 011 – Setor de Engenharia / SIOPT

**Ao
Departamento de Convênios e Planejamento**


Prezado Dênis,

Pedimos escusas pela insistência, mas reiteramos o contido na C.I. n° 212 (cópia anexa) emitida em 02 de abril de 2014.

Somos sabedores de que você encaminhou para a Secretaria de Fazenda a citada C.I. (pois a Senhora Ana Murbach está atualmente lotada nessa Secretaria), mas nada aconteceu até agora.

Nos preocupa que os Ministérios venham a solicitar esses Termos de Recebimento Provisório e Definitivo e esse fato venha a acarretar problemas ao Município pela não emissão dos mesmos.

Atenciosamente,


Antônio Carlos Pasdiora
Eng° Civil – CREA 10.633-D-PR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTE
Rua Nossa Senhora de Fátima, n° 563 – Bairro Estação – Lapa / PR
CEP 83750-000 - (41) 3911-1104



PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

ESTADO DO PARANÁ

Alameda David Carneiro, 243 - Centro
CEP 83750-000 - (41) 3547-8000
www.lapa.pr.gov.br

DOC ~~III~~ VII

Folha
Nº 001

Ofício nº 076/2018/SMOUPT/DCCR

Lapa, 14 de junho de 2018.

Ao Ilustríssimo Senhor

PAULO JOSÉ BASTOS MORAES

Chefe de Gabinete Substituto

Coordenação Geral de Convênios

Ministério do Turismo

Esplanada dos Ministérios, Bloco U, 2º andar, Sala 2017 – Bairro Zona Cívico-Administrativa

CEP: 70.065-900

Brasília - DF

Assunto: Complementação da Prestação de Contas do Convênio nº 752.552/2010

Referente: Processo nº 72031.007155/2018-58

Prezado Senhor:

Em atenção ao Parecer Financeiro nº 547/2018, informamos que a documentação abaixo informada foi inserida na data de hoje no SICONV na aba anexos da prestação de contas:

1. Ata de Adjudicação e Termo de Homologação TP 023/2010;
2. Notas Fiscais 12, 13, 14, 15 e 16 contendo a indicação do número do Convênio;
3. Declaração de Notificação aos Partidos Políticos quando do recebimento de recursos;
4. Relatório Prévio;
5. Anteprojeto (em três partes);
6. Orçamento Prévio de Elaboração de Projeto Executivo.

Atenciosamente,

Denis Magalhães Coelho
Chefe da Divisão de Convênios e Contratos de Repasse



MUNICÍPIO DA LAPA
ESTADO DO PARANÁ

DOC. ~~III~~ **LX**
E ADENSOS

Folha
Nº **001**

**PROJETO DOS PARQUES VILA DO PRÍNCIPE E
PARQUE JARDIM ESPLANADA/MONTREAL**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 30/07/2019 15:36:03.00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR [HTTPS://WWW.ATEIDE.NET/PC0408E31B59EC](https://www.ateide.net/PC0408E31B59EC)



Assinado digitalmente por:
PAULO CESAR PIATES FURIATI
200.819.439-04
30/07/2019 15:36:31

PREFEITURA
MUNICIPAL DA LAPA

Volume 2 – Ante-Projeto
FEVEREIRO DE 2011

Município da Lapa
Prefeito Paulo César Fiates Furiati

Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo
Departamento de Obras Públicas
Eng. Cível Antonio Carlos Pasdiora

Secretaria de Planejamento, Controle e Suplemento
Sec. Juciel Vilmar Jungles dos Santos
Ana Maria Murbach Bortolanza

Parque da vila do príncipe e Jrd Esplanada
complementação - circuito histórico ambiental da Lapa

Comprometida com o desenvolvimento local e com a geração de novas possibilidades sócio-econômicas e culturais, a Gestão Municipal coloca o Turismo - setor de fortes impactos econômicos e sociais – como mais uma opção para tornar a Lapa uma cidade inclusiva e acolhedora para o trabalho e o lazer dos seus cidadãos.

Folha
Nº 003
JP

A Elaboração do Projeto para Estruturação do Circuito Histórico e Ambiental da Lapa, teve como finalidade desenvolver soluções técnicas de arquitetura e engenharia no sentido de promover a melhoria da circulação de pedestres e veículos, bem como a preservação dos córregos do município, ruas e praça que são periféricas ao centro histórico, além de incrementar o potencial turístico existente no município.

Com a estruturação do córrego Passo dos Neves e a criação de um circuito de visitação com parque linear, garantiu-se a manutenção deste córrego e a preservação do mesmo, bem como controle de cheias no local.

O córrego do Passo da Ronda também parte do circuito citado anteriormente teve seu projeto elaborado e está em vias de ter recurso para execução junto ao PAC 2.

Agora o Município da Lapa vem pedir apoio para a complementação do Circuito Histórico Ambiental, com a realização de dois novos projetos de Parque Linear, contemplando os Córregos localizados na Vila Príncipe e no Jardim Esplanada.

Estes córregos somados tem 1600m de extensão, sendo 1100m o Córrego Vila Príncipe e 500m o córrego do Jardim Esplanada.

Parque da vila do príncipe e Jrd Esplanada
complementação - circuito histórico ambiental da Lapa

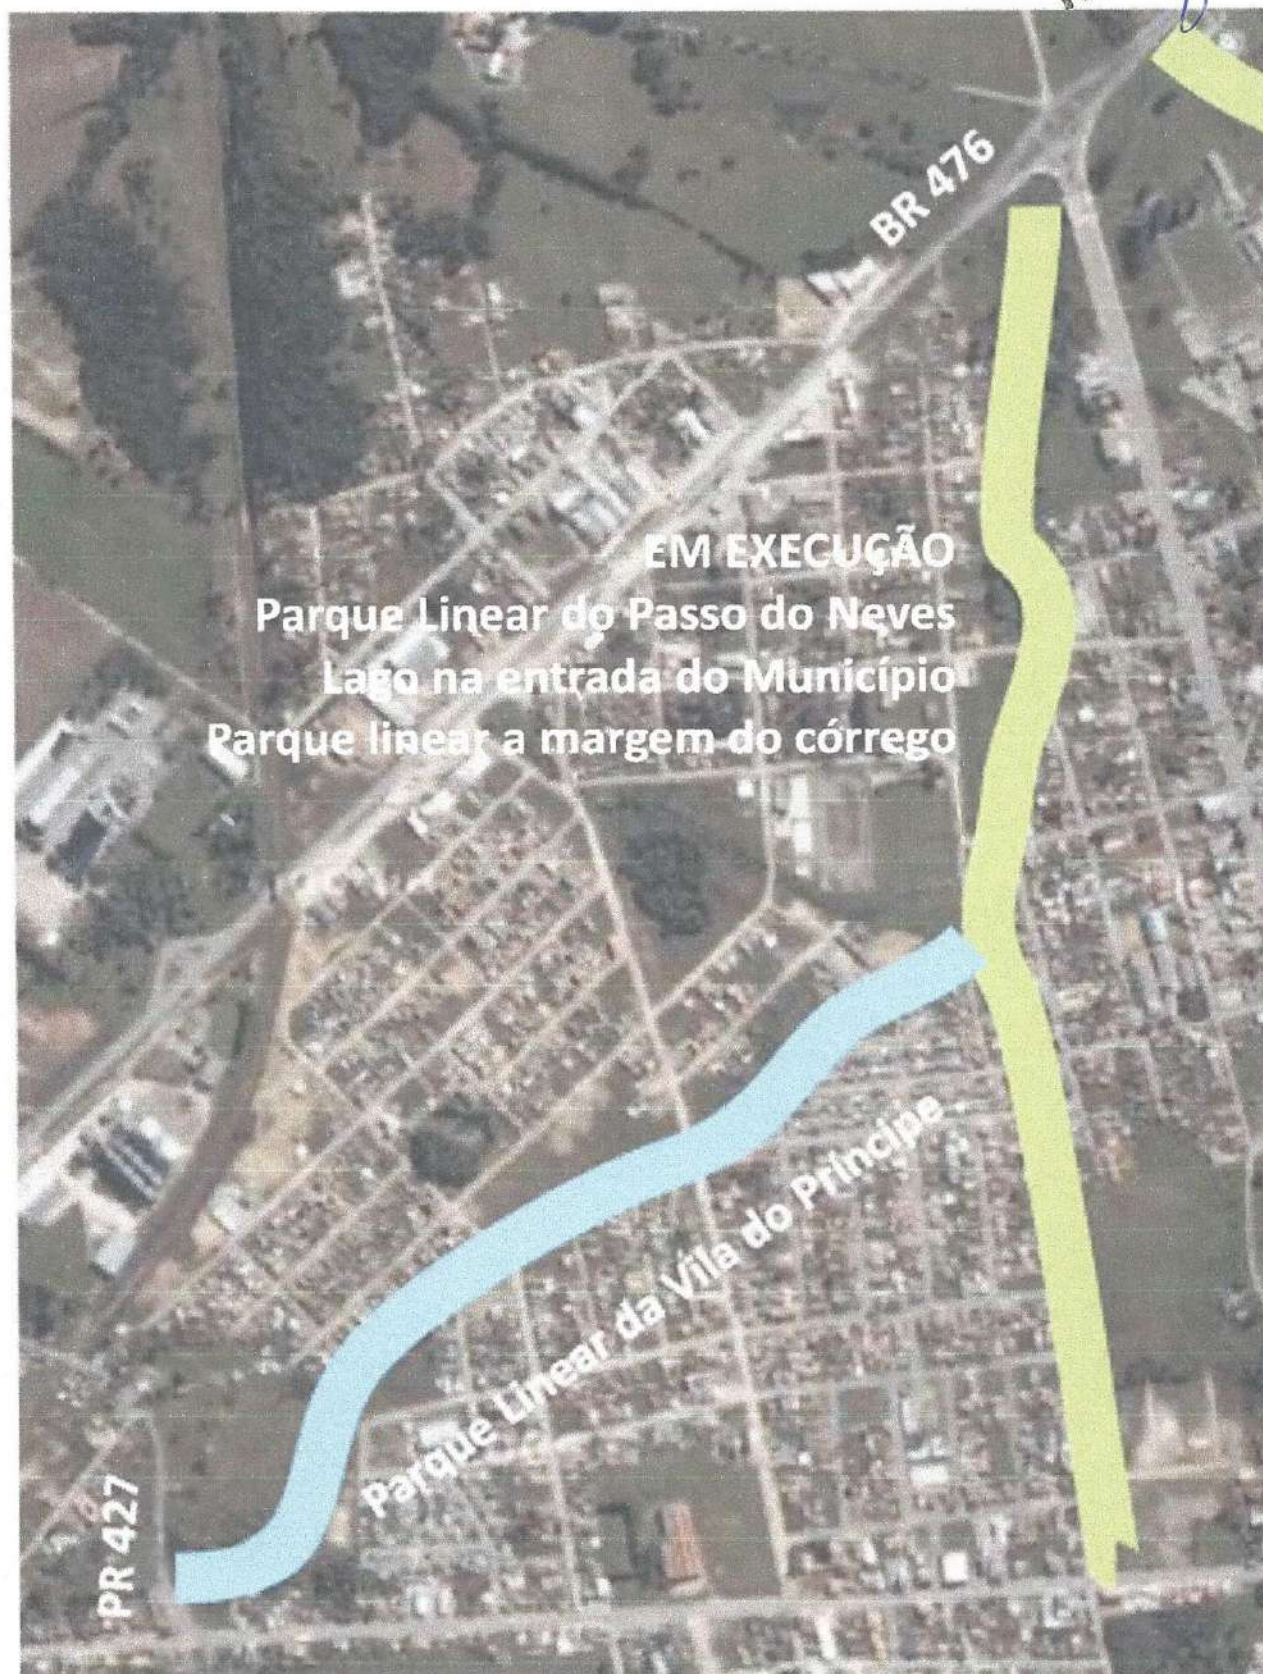
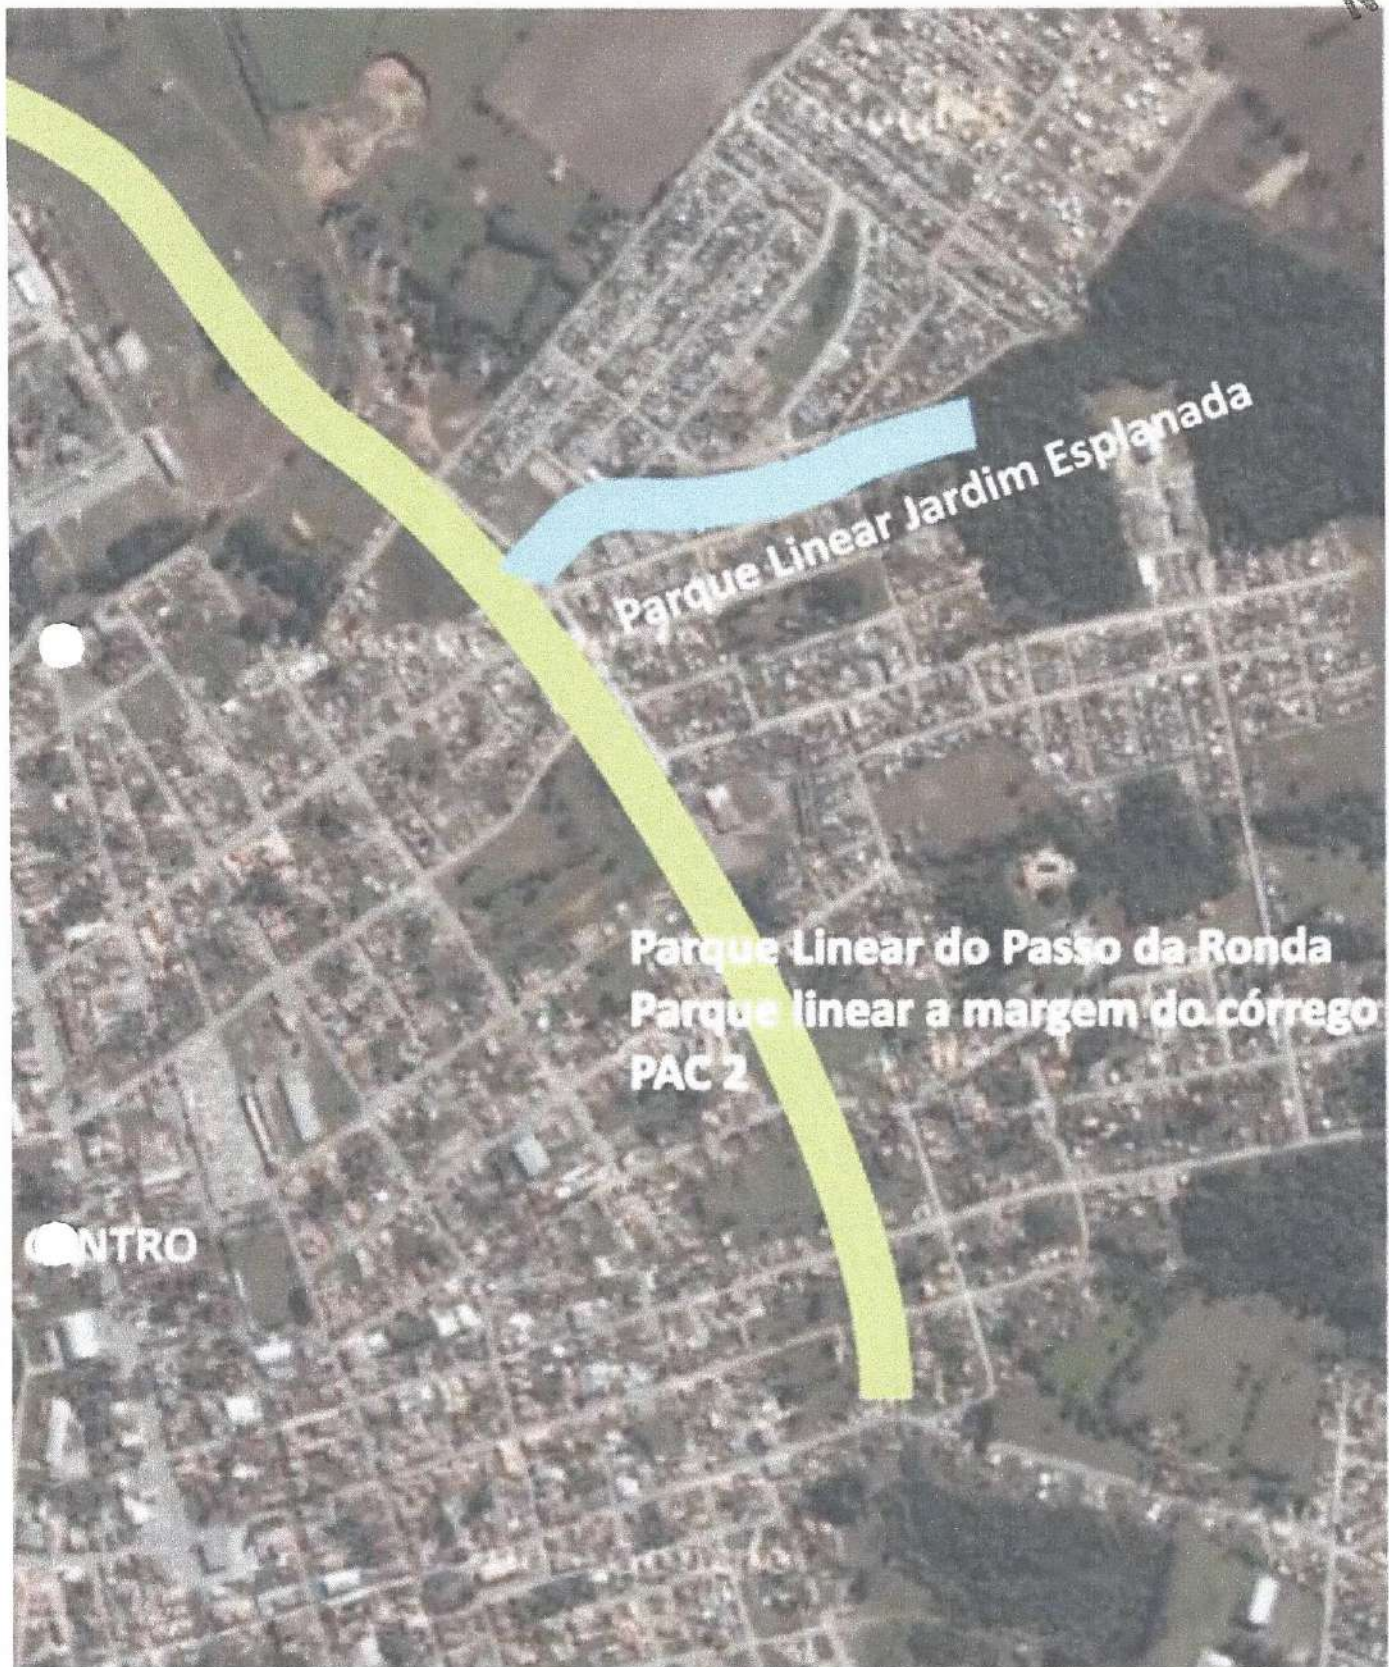


Foto Aérea do Município da Lapa



Parque da vila do príncipe e Jrd Esplanada
complementação - circuito histórico ambiental da Lapa

Parque da vila do príncipe e Jrd Esplanada
complementação - circuito histórico ambiental da Lapa



Córrego da Vila do Príncipe



Parque Linear do Jardim Esplanada
Córrego no lado leste do município
Do Bosque nativo ao Parque da ronda
extensão do projeto 500m

EM EXECUÇÃO

Parque Linear do Passo do Neves

Lago na entrada do Município

Parque linear a margem do córrego



Foto Aérea do Município da Lapa



Córrego do Jardim Esplanada



Parque da vila do príncipe e Jrd Esplanada
complementação - circuito histórico ambiental da Lapa



Centro Histórico - tombado pelo IPHAN

Doc IX
Folha
Nº 001

Parque da vila do príncipe e Jrd Esplanada
complementação - circuito histórico ambiental da Lapa



MUNICÍPIO DA LAPA
ESTADO DO PARANÁ

2014
Folha
Nº 12

EQUIPE - CONSULTORA

Coodenadora

Arquiteta: **Christine Morva**



Assinado digitalmente
PAULO CESAR FIATES FURTADO
200.849.439-04
30/07/2019 15:36:31

PREFEITURA
MUNICÍPIO DA LAPA

Projeto Urbanístico

Arquiteta: **Christine Morva**

Levantamento Topográfico e Cadastral

Transição serviços topográficos Ltda

Topógrafo: **Luis Carlos Leodoro**

Projeto de Canalização

Engenheiro Civil: **Viktor Barras**





MUNICÍPIO DA LAPA
ESTADO DO PARANÁ

DOC. IX
Folha
Nº 11

PROJETO DOS PARQUES VILA PRÍNCIPE E JRD ESPLANADA/MONTREAL
ANTE PROJETO

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	04
1 LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO	05
2 MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS BACIAS - VAZÃO E ESTRUTURA.....	09
3 ANEXO I - PROJETO PRELIMINAR VILA DO PRÍNCIPE	14
4 ANEXO II - PROJETO PRELIMINAR JRD ESPLANADA/MONTREAL.....	17

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2019 15:36:03-00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSO: [HTTPS://C.ATENDE.NET/PSD408E31B568EC](https://c.atende.net/psd408e31b568ec)



Assinado digitalmente por:
PAULO CESAR FIATES FURIATI
200.849.439-04
30/07/2019 15:36:31

PREFEITURA
MUNICIPAL DA LAPA



APRESENTAÇÃO

O presente volume é um dos componentes dos trabalhos referentes ao PROJETO DOS PARQUES VILA PRÍNCIPE E JRD. ESPLANADA/MONTREAL, de acordo com o contrato, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA e a Empresa ChristineMorva²Arquitetura ME.

Este Volume II apresenta o Ante-projeto, cuja finalidade é a fornecer dados referentes a bacia hidrográfica do município e ideias concebidas para desenvolvimento do entorno e ocupação das áreas junto aos córregos dos Parques Vila Príncipe e Jrd. Esplanada/Montreal na área urbana do município da Lapa-PR.

O presente volume de Ante-projeto se aplica a área proposta de intervenção.

Estas áreas estão delimitadas ocupando o limite máximo de 15m dos eixos dos córregos, divididos da seguinte forma:

O córrego existente na Vila Príncipe início junto a rua Aloisio Leoni, dando segmento no eixo da av. Papa João XXIII, até o cruzamento com a Av. Jucelino Kubitschek onde acompanha a lateral do conjunto mons. Oswaldo Fallarz até o final no encontro com o córrego dos Neves.

O córrego do Jardim Esplanada/Montreal com início junto ao bosque, criando uma ampla área de lazer até a rua Luciano de Lacerda, onde após o cruzamento segue até a rua Luiz Correia de Lacerda onde se encontra o córrego tubulado até a união com o Córrego Passo da Ronda.

No item 01 – Levantamento Fotográfico com as áreas trabalhadas.

O item 02 - Memória de cálculo das bacias - vazão e estrutura, registrando declividade, fator de impermeabilização e recorrência de 50 anos para cálculo da vazão necessária para o controle de cheias e determinação dos canais a serem implantados.

O item 03 – Projeto preliminar Vila Príncipe com a canalização e a proposta de utilização da área.

O item 04 – Projeto preliminar Jrd Esplanada/Montreal também com a canalização e a proposta de utilização da área.

O item 05 – Projeto preliminar dos equipamentos dos Parques.





1. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO



1. Córrego da Vila do Príncipe
Início na rua Aloisio Leone



2. Córrego da Vila do Príncipe
Rua Pedro Francisco Bianchini



3. Córrego da Vila do Príncipe
Área de lazer municipal 1



4. Córrego da Vila do Príncipe
Área de lazer municipal 1



5. Córrego da Vila do Príncipe
Área de lazer municipal 1



6. Córrego da Vila do Príncipe
Área de lazer municipal 1





7. Córrego da Vila do Príncipe
Av. Papa João Paulo XXIII



8. Córrego da Vila do Príncipe
Av. Papa João Paulo XXIII



9. Córrego da Vila do Príncipe
Travessia av Jucelino Kubitschek



10. Córrego da Vila do Príncipe
Travessia av Jucelino Kubitschek



11. Córrego da Vila do Príncipe
Travessia av Jucelino Kubitschek





11. Córrego da Vila do Príncipe
Área de lazer municipal 2



12. Córrego da Vila do Príncipe
Margens do cj. Mons. Osvaldo Fallarz



13. Córrego da Vila do Príncipe
Margens do cj. Mons. Osvaldo Fallarz

ESTE DOCUMENTO FOR ASSINADO EM 30/07/2019 15:36:31
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSO HTTPS://C.ATENDE.NET/P5D408E31B56EC



Assinado digitalmente por:
PAULO CESAR FIATES FURIATI
200.849.439-04
30/07/2019 15:36:31

PREFEITURA
MUNICIPAL DA LAPA



14. Córrego do Jardim Esplanada/Montreal
Área ocupada entre as ruas Agenor Scandelari e Ten Alfredo Seabra



15. Córrego do Jardim Esplanada/Montreal
Área alagada junto ao Bosque



16. Córrego do Jardim Esplanada/Montreal
Bosque junto a rua Arthur Virmond de Lacerda





MUNICÍPIO DA LAPA ESTADO DO PARANÁ

Folha
Nº 017
8

2. MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS BACIAS - VAZÃO E ESTRUTURA

CÓRREGO JRD. ESPLANADA/MONTREAL

VAZÃO
Cálculo das áreas das bacias (ha).

Área	Áreas (ha)	
	parciais	extensão
N.º1	12.11	545.01
N.º2	11.78	238.69
N.º3	8.84	32.73
N.º4	24.87	57.60
N.º5	8.95	66.55
N.º6	7.96	74.51
N.º7	7.27	81.78
N.º8	3.69	85.47
total	85.37	1.890.72

CÁLCULO DA DECLIVIDADE MÉDIA
COTA 930
DECLIVIDADE 2.66%

Cálculo da Intensidade de Chuva.			
tempo 't'	5	10	15
I=	326.87	325.67	324.49
			320.97

período de recorrência
50 anos

PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA
Assinado por: JES FURIATI
07/2019 15:36:31

Tipos de Cobertura	Área (ha)	%	C	C médio
Telhados e áreas Pav	436.67	10%	0.90	0.36
Áreas npav s/veget.	310.00	45%	0.40	C adaptado
Áreas npav c/veget.	620.00	45%	0.20	
ÁREA TOTAL	1366.67	100%		

ÁREA Nº	QT (vazão)			
	5	10	15	30
1	3.962	3.947	3.933	3.890
2	7.615	7.787	7.758	7.674
3	10.707	10.668	10.629	10.514
4	18.843	18.774	18.705	18.503
5	21.771	21.691	21.612	21.378
6	24.375	24.285	24.197	23.934
7	26.753	26.655	26.558	26.270
8	27.960	27.858	27.756	27.455
máximo	27.960	27.858	27.756	27.455

rec 50 anos

CANAL
200x200
200x200
200x200
200x200





MUNICÍPIO DA LAPA ESTADO DO PARANÁ

Folha
Nº 018

CÓRREGO VILA DO PRÍNCIPE

VAZÃO	
Cálculo das áreas das bacias (ha).	

Áreas (ha)	
Áreas parciais	extensão
N.º1	3,40
N.º2	25,23
N.º3	10,26
N.º4	19,41
N.º5	20,97
N.º6	34,22
N.º7	21,37
N.º8	34,66
N.º9	37,01
N.º10	57,40
Total	263,93

1,128.15

CÁLCULO DA DECLIVIDADE MÉDIA
COTA DECLIVIDADE
930

885
45 2,00%

Cálculo da Intensidade de Chuva.			
tempo	5	10	15
I=	326,87	325,67	324,49
			320,97

período de recorrência
50 anos



Assinado digitalmente por: JURIATI

Tipos de Cobertura	Área	%	C	C médio
Telhados e áreas Pav	35,436.67	10%	0,90	0,36
Áreas ripav s/veget.	310,00	45%	0,40	C adaptado
Áreas ripav s/veget.	620,00	45%	0,20	
ÁREA TOTAL	2,680,300,00	100%		

ÁREA Nº	QT (vazão)				
	5	10	15	30	
1	1,112	1,108	1,104	1,092	rec 50 anos
2	9,366	9,332	9,297	9,197	
3	12,722	12,676	12,629	12,492	
4	19,072	19,002	18,933	18,727	pto 0
5	25,932	25,837	25,743	25,464	
6	37,126	36,990	36,855	36,456	
7	44,117	43,956	43,795	43,320	pto 31
8	55,456	55,253	55,051	54,454	
9	67,563	67,315	67,070	66,343	
10	86,340	86,024	85,710	84,781	pto 57
máximo	86,340	86,024	85,710	84,781	

CANAL
250x200
350x200
400x200



MUNICÍPIO DA LAPA
ESTADO DO PARANÁ

DOC 2X
Folha
Nº 09

CÁLCULO ESTRUTURAL DOS CANAIS

Ø	5.4
w	0
i	0
δ	20
Kp	1.678

Ø	5.4
w	0
i	0
δ	20
Ka	0.724

ARMAÇÃO DE PAREDES 1 E 2

LARGURA MÁXIMA-ix	4.28
ALTURA MÁXIMA-iy	4.7
EMPUXO ATIVO MAX	15.19
Q	6.46
s	0.91
m _x	51.58
m _y	40.39
M _x	2.30
M _y	3.53
H	30

	kc	ks	S Ø	Ø	S unit Ø	N Ø	ESPAÇAMENTO	
							CALCULADO	ADOTADO
N-1	317.63	0.23	1.96	0.80	0.503	4	25	20
N-2	206.27	0.23	3.01	1.00	0.785	4	25	20



Assinado digitalmente por:
PAULO CESAR FIATES FURIATI
200.849.439-04
30/07/2019 15:36:51

ARMAÇÃO DO FUNDO

LARGURA MÁXIMA-ix	3.2
ALTURA MÁXIMA-iy	4.7
EMPUXO ATIVO MAX	15.19
Q	6.46
s	0.68
m _x	98.507
m _y	23.99
M _x	0.67
M _y	5.95
H	30

	kc	ks	S Ø	Ø	S unit Ø	N Ø	ESPAÇAMENTO	
							CALCULADO	ADOTADO
N-1	1085.16	0.23	0.57	0.80	0.503	2	50	20
N-2	122.52	0.24	5.29	1.25	1.227	5	20	20





MUNICÍPIO DA LAPA ESTADO DO PARANÁ

doc 2x
Folha
Nº 020
R

$$V = \frac{A}{n} \cdot R^{2/3} \cdot I^{1/2}$$

CANAL ABERTO		2.00	2.00					
Declividade	Declividade	h	p	Área	n	R	V	Veloc
1.00%	0.0100	1.80	5.600	3.6000	0.012	0.6429	22.346	6.21
1.50%	0.0150	1.80	5.600	3.6000	0.012	0.6429	27.368	7.60
2.00%	0.0200	1.80	5.600	3.6000	0.012	0.6429	31.602	8.78
2.50%	0.0250	1.80	5.600	3.6000	0.012	0.6429	35.332	9.81
3.00%	0.0300	1.80	5.600	3.6000	0.012	0.6429	38.704	10.75
3.50%	0.0350	1.80	5.600	3.6000	0.012	0.6429	41.805	11.61
4.00%	0.0400	1.80	5.600	3.6000	0.012	0.6429	44.692	12.41
4.50%	0.0450	1.80	5.600	3.6000	0.012	0.6429	47.403	13.17
5.00%	0.0500	1.80	5.600	3.6000	0.012	0.6429	49.967	13.88

CANAL ABERTO		2.50	2.00					
Declividade	Declividade	h	p	Área	n	R	V	Veloc
1.00%	0.0100	1.80	6.100	4.5000	0.012	0.7377	30.616	6.80
1.50%	0.0150	1.80	6.100	4.5000	0.012	0.7377	37.497	8.33
2.00%	0.0200	1.80	6.100	4.5000	0.012	0.7377	43.298	9.62
2.50%	0.0250	1.80	6.100	4.5000	0.012	0.7377	48.409	10.76
3.00%	0.0300	1.80	6.100	4.5000	0.012	0.7377	53.029	11.78
3.50%	0.0350	1.80	6.100	4.5000	0.012	0.7377	57.278	12.73
4.00%	0.0400	1.80	6.100	4.5000	0.012	0.7377	61.233	13.61
4.50%	0.0450	1.80	6.100	4.5000	0.012	0.7377	64.947	14.43
5.00%	0.0500	1.80	6.100	4.5000	0.012	0.7377	68.460	15.21

CANAL ABERTO		3.50	2.00					
Declividade	Declividade	h	p	Área	n	R	V	Veloc
1.00%	0.0100	1.80	7.100	6.3000	0.012	0.8873	48.478	7.69
1.50%	0.0150	1.80	7.100	6.3000	0.012	0.8873	59.374	9.42
2.00%	0.0200	1.80	7.100	6.3000	0.012	0.8873	68.559	10.88
2.50%	0.0250	1.80	7.100	6.3000	0.012	0.8873	76.651	12.17
3.00%	0.0300	1.80	7.100	6.3000	0.012	0.8873	83.967	13.33
3.50%	0.0350	1.80	7.100	6.3000	0.012	0.8873	90.695	14.40
4.00%	0.0400	1.80	7.100	6.3000	0.012	0.8873	96.957	15.39
4.50%	0.0450	1.80	7.100	6.3000	0.012	0.8873	102.838	16.32
5.00%	0.0500	1.80	7.100	6.3000	0.012	0.8873	108.401	17.21

CANAL ABERTO		7.00	2.00					
Declividade	Declividade	h	p	Área	n	R	V	Veloc
1.00%	0.0100	1.80	10.600	12.6000	0.012	1.1887	117.824	9.35
1.50%	0.0150	1.80	10.600	12.6000	0.012	1.1887	144.304	11.45
2.00%	0.0200	1.80	10.600	12.6000	0.012	1.1887	166.628	13.22
2.50%	0.0250	1.80	10.600	12.6000	0.012	1.1887	186.296	14.79
3.00%	0.0300	1.80	10.600	12.6000	0.012	1.1887	204.077	16.20
3.50%	0.0350	1.80	10.600	12.6000	0.012	1.1887	220.428	17.49
4.00%	0.0400	1.80	10.600	12.6000	0.012	1.1887	235.647	18.70
4.50%	0.0450	1.80	10.600	12.6000	0.012	1.1887	249.942	19.84
5.00%	0.0500	1.80	10.600	12.6000	0.012	1.1887	263.462	20.91

Assinado digitalmente por:
PAULO CESAR FINES FURLATO
200.849.439-04
30/07/2019 15:38
PREFEITURA





MUNICÍPIO DA LAPA ESTADO DO PARANÁ

Folha
Nº 021

CANAL ABERTO		7.00	1.80	TRAPEZOIDAL TALUDE 1V:1,5H			CONSIDERADO FUNDO	
Declividade	Declividade	<i>h</i>	<i>p</i>	Área	<i>n</i>	R	<i>V</i>	<i>Veloc</i>
1.00%	0.0100	1.62	12.841	15.2766	0.012	1.1897	142.932	9.36
1.50%	0.0150	1.62	12.841	15.2766	0.012	1.1897	175.056	11.46
2.00%	0.0200	1.62	12.841	15.2766	0.012	1.1897	202.137	13.23
2.50%	0.0250	1.62	12.841	15.2766	0.012	1.1897	225.996	14.79
3.00%	0.0300	1.62	12.841	15.2766	0.012	1.1897	247.566	16.21
3.50%	0.0350	1.62	12.841	15.2766	0.012	1.1897	267.402	17.50
4.00%	0.0400	1.62	12.841	15.2766	0.012	1.1897	285.865	18.71
4.50%	0.0450	1.62	12.841	15.2766	0.012	1.1897	303.208	19.85
5.00%	0.0500	1.62	12.841	15.2766	0.012	1.1897	319.607	20.92

GALERIA DUPLA		4.00	2.00					
Declividade	Declividade	<i>h</i>	<i>p</i>	Área	<i>n</i>	R	<i>V</i>	<i>Veloc</i>
1.00%	0.0100	1.80	15.200	14.4000	0.012	0.9474	115.752	8.04
1.50%	0.0150	1.80	15.200	14.4000	0.012	0.9474	141.766	9.84
2.00%	0.0200	1.80	15.200	14.4000	0.012	0.9474	163.698	11.37
2.50%	0.0250	1.80	15.200	14.4000	0.012	0.9474	183.019	12.71
3.00%	0.0300	1.80	15.200	14.4000	0.012	0.9474	200.488	13.92
3.50%	0.0350	1.80	15.200	14.4000	0.012	0.9474	216.552	15.04
4.00%	0.0400	1.80	15.200	14.4000	0.012	0.9474	231.503	16.08
4.50%	0.0450	1.80	15.200	14.4000	0.012	0.9474	245.546	17.05
5.00%	0.0500	1.80	15.200	14.4000	0.012	0.9474	258.829	17.97

GALERIA SIMPLES		4.00	2.50					
Declividade	Declividade	<i>h</i>	<i>p</i>	Área	<i>n</i>	R	<i>V</i>	<i>Veloc</i>
1.00%	0.0100	2.25	8.500	9.0000	0.012	1.0588	77.913	8.66
1.50%	0.0150	2.25	8.500	9.0000	0.012	1.0588	95.424	10.60
2.00%	0.0200	2.25	8.500	9.0000	0.012	1.0588	110.186	12.24
2.50%	0.0250	2.25	8.500	9.0000	0.012	1.0588	123.191	13.69
3.00%	0.0300	2.25	8.500	9.0000	0.012	1.0588	134.949	14.99
3.50%	0.0350	2.25	8.500	9.0000	0.012	1.0588	145.762	16.20
4.00%	0.0400	2.25	8.500	9.0000	0.012	1.0588	155.826	17.31
4.50%	0.0450	2.25	8.500	9.0000	0.012	1.0588	165.279	18.36
5.00%	0.0500	2.25	8.500	9.0000	0.012	1.0588	174.219	19.36

Assinado digitalmente por:
PAULO CESAR FIATES FURIATI
200.649.439-04
30/07/2019 15:36:31
PREFEITURA
MUNICIPAL DA LAPA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2019 15:36:03-00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSO: HTTPS://C.ATENDE.NET/F5D408E31B56EC





MUNICÍPIO DA LAPA ESTADO DO PARANÁ

Folha
Nº 022

$$V = \frac{A}{n} \cdot R^{2/3} \cdot i^{1/2}$$

CANAL ABERTO		2.00	2.00					
Declividade	Declividade	<i>h</i>	<i>p</i>	Área	<i>n</i>	R	<i>V</i>	Veloc
1.00%	0.0100	1.80	5.600	3.6000	0.012	0.6429	22.346	6.21
1.50%	0.0150	1.80	5.600	3.6000	0.012	0.6429	27.368	7.60
2.00%	0.0200	1.80	5.600	3.6000	0.012	0.6429	31.602	8.78
2.50%	0.0250	1.80	5.600	3.6000	0.012	0.6429	35.332	9.81
3.00%	0.0300	1.80	5.600	3.6000	0.012	0.6429	38.704	10.75
3.50%	0.0350	1.80	5.600	3.6000	0.012	0.6429	41.805	11.61
4.00%	0.0400	1.80	5.600	3.6000	0.012	0.6429	44.692	12.41
4.50%	0.0450	1.80	5.600	3.6000	0.012	0.6429	47.403	13.17
5.00%	0.0500	1.80	5.600	3.6000	0.012	0.6429	49.967	13.88

CANAL ABERTO		2.50	2.00					
Declividade	Declividade	<i>h</i>	<i>p</i>	Área	<i>n</i>	R	<i>V</i>	Veloc
1.00%	0.0100	1.80	6.100	4.5000	0.012	0.7377	30.616	6.80
1.50%	0.0150	1.80	6.100	4.5000	0.012	0.7377	37.497	8.33
2.00%	0.0200	1.80	6.100	4.5000	0.012	0.7377	43.298	9.62
2.50%	0.0250	1.80	6.100	4.5000	0.012	0.7377	48.409	10.76
3.00%	0.0300	1.80	6.100	4.5000	0.012	0.7377	53.029	11.78
3.50%	0.0350	1.80	6.100	4.5000	0.012	0.7377	57.278	12.73
4.00%	0.0400	1.80	6.100	4.5000	0.012	0.7377	61.233	13.61
4.50%	0.0450	1.80	6.100	4.5000	0.012	0.7377	64.947	14.43
5.00%	0.0500	1.80	6.100	4.5000	0.012	0.7377	68.460	15.21

CANAL ABERTO		3.50	2.00					
Declividade	Declividade	<i>h</i>	<i>p</i>	Área	<i>n</i>	R	<i>V</i>	Veloc
1.00%	0.0100	1.80	7.100	6.3000	0.012	0.8873	48.478	7.69
1.50%	0.0150	1.80	7.100	6.3000	0.012	0.8873	59.374	9.42
2.00%	0.0200	1.80	7.100	6.3000	0.012	0.8873	68.559	10.88
2.50%	0.0250	1.80	7.100	6.3000	0.012	0.8873	76.651	12.17
3.00%	0.0300	1.80	7.100	6.3000	0.012	0.8873	83.967	13.33
3.50%	0.0350	1.80	7.100	6.3000	0.012	0.8873	90.695	14.40
4.00%	0.0400	1.80	7.100	6.3000	0.012	0.8873	96.957	15.39
4.50%	0.0450	1.80	7.100	6.3000	0.012	0.8873	102.838	16.32
5.00%	0.0500	1.80	7.100	6.3000	0.012	0.8873	108.401	17.21

CANAL ABERTO		7.00	2.00					
Declividade	Declividade	<i>h</i>	<i>p</i>	Área	<i>n</i>	R	<i>V</i>	Veloc
1.00%	0.0100	1.80	10.600	12.6000	0.012	1.1887	117.824	9.35
1.50%	0.0150	1.80	10.600	12.6000	0.012	1.1887	144.304	11.45
2.00%	0.0200	1.80	10.600	12.6000	0.012	1.1887	166.628	13.22
2.50%	0.0250	1.80	10.600	12.6000	0.012	1.1887	186.296	14.79
3.00%	0.0300	1.80	10.600	12.6000	0.012	1.1887	204.077	16.20
3.50%	0.0350	1.80	10.600	12.6000	0.012	1.1887	220.428	17.49
4.00%	0.0400	1.80	10.600	12.6000	0.012	1.1887	235.647	18.70
4.50%	0.0450	1.80	10.600	12.6000	0.012	1.1887	249.942	19.84
5.00%	0.0500	1.80	10.600	12.6000	0.012	1.1887	263.441	20.93



Assinado eletronicamente por:
PÁULO CESAR ELIAS E/OU
200.849.439-04
30/07/2019 15:36:31





PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA ^{Folha}

ESTADO DO PARANÁ

Alameda David Carneiro, 243 - Centro
CEP 83750-000 - (41) 3547-8000
www.lapa.pr.gov.br

Nº 01

Relatório Convênio nº 752552/2010/MTUR

Objeto: Elaboração do projeto de estruturação do circuito histórico e ambiental da Lapa – Implantação de Parque linear na orla do Córrego Vila do Príncipe e Córrego Jardim Esplanada.

Assinatura do Convênio: 17/12/2010.

Final da vigência: 30/09/2011.

Prestação de Contas enviada ao Ministério: 22/03/2014.

Valores utilizados: R\$ 294.000,00 + R\$ 6.000,00 contrapartida = R\$ 300.000,00

Considerações a respeito do resultado da análise da prestação de contas:

- 1) A análise final da prestação de contas concluiu que, em síntese: a) Quanto à realização do objeto (execução física): APROVADA EM PARTE e b) Quanto à regularidade da aplicação financeira: APROVADA EM PARTE;
- 2) As glosas apontadas pelo Ministério se referem aos produtos: RELATÓRIO PRÉVIO R\$ 45.000,00 E ANTEPROJETO R\$ 60.000,00;
- 3) Ocorre que, após diligências realizadas em diversos setores da Administração Municipal foi localizado apenas a versão original e final do Anteprojeto, datado de 23 de fevereiro de 2011, realizado pela empresa contratada e pago pelo Município com recursos oriundos do Convênio em tela, e acostado ao processo de prestação de contas na data de 29/07/2019 (divididos em 03 arquivos);
- 4) Contudo, em relação ao Relatório Prévio o único documento localizado é aquele que já se encontra anexado ao processo, que não corresponde ao solicitado pelo Ministério. Porém verifica-se que o relatório prévio é parte integrante, única e exclusivamente, da META 01 do Plano de trabalho do Convênio, e sem o qual não se poderia realizar o projeto executivo confeccionado e já aprovado na prestação de contas em comento;
- 5) O Ministério não acatou o complemento da documentação da prestação de contas e ratificou as glosas solicitando a devolução dos recursos referentes aos produtos informados no item 2;
- 6) O Ministério incluiu situação de inadimplência perante o SIAFI para o Convênio em questão, restando ao Município fazer o pagamento dos valores glosados, com a finalidade de não haver bloqueios de recursos para os demais Convênios do Município;
- 7) Cabe esclarecer que o Projeto Executivo foi aprovado integralmente pelo Ministério, e para a conclusão do mesmo, a elaboração dos produtos do item 2 se fazia necessária, podemos concluir que apenas estes produtos não foram anexados no sistema junto às notas fiscais.

Atenciosamente,

Denis Magalhães Coelho
Chefe da Divisão de Convênios e Contratos de Repasse

Ofício. nº 334/2019 – Gab/Prefeito

Lapa, 30 de julho de 2019.

DOC XI

Folha
Nº 01

Referente ao Ofício n.º 1732/2019/CGCV/SPOA/GSE/SE

Processo: 72031.007155/2018-58

Assunto: Complementação da Prestação de Contas do Convênio 752.552/2010

Ilmo. Senhor,

O MUNICÍPIO DA LAPA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 76.020.452/0001-05, com sede administrativa na Alameda David Carneiro, nº 243, Centro, Lapa, PR, neste ato representado pelo seu Prefeito, *in fine*, em atendimento aos termos do ofício supra, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, expor o que segue:

1) A análise final da prestação de contas referente ao convênio SIAFI/SICONV nº 752.552/2010, concluiu que, em síntese:

- a) Quanto à realização do objeto (execução física): APROVADA EM PARTE, conforme nota técnica nº 002/2019; e,
- b) Quanto à regularidade da aplicação financeira: APROVADA EM PARTE, conforme parecer financeiro nº 489/2019

Aos cuidados de:

PAULO JOSÉ BASTOS MARAES

GESTOR FINANCEIRO – COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS

MINISTÉRIO DO TURISMO

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS – BLOCO “U” – 2º ANDAR – SALA 217 – BAIRRO ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA.

CEP: 70.065-900

BRASÍLIA - DF



Assinado digitalmente por:
PAULO CESAR FIATES FURIATI
200.849.439-04
30/07/2019 15:35:13

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2019 15:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: [HTTPS://C.ATENDE.NET/P/5D408DE3570CA](https://c.atende.net/p/5d408de3570ca)

Folha
Nº 02
B

A Nota Técnica nº 002/2019 e o parecer financeiro nº 489/2019, por sua vez, concluíram que, respectivamente:

Diante do exposto, considerando especificamente o relatório prévio e o anteprojeto objetos de indeferimento da prestação de contas final que estão detalhados no item 2.2 (verificação) desta Nota Técnica, não se verifica a possibilidade de acatar o pedido de reconsideração, mantendo-se o mérito da sua reprovação, ratificando o que foi exarado no Parecer de nº 05/2018/CGAS/DIETU referente à prestação de contas final na glosa de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

O conteúdo ora versado, não exclui a necessidade da análise financeira e/ou Jurídica pelos setores competentes deste Ministério.

DESPESA S PENDITES	
CONCEDENTE	R\$ 109.877,03
OUTRAS (VENDA)	R\$ 0,00
GLOSA TOTAL	R\$ 109.877,03
Devolução	R\$ 8.915,34
A DEVOLVER/COMPROVAR	R\$ 102.761,69

Obs: O quadro acima refere-se aos valores líquidos verificados na presente análise. Cumpre esclarecer que o valor a ser considerado para a devolução é o devidamente corrigido, conforme cálculos do sistema do TCU em anexo.

20 RESULTADO FINAL DA ANÁLISE FINANCEIRA

Assim, este Ministério do Turismo, através do Ofício em epígrafe, determinou a o recolhimento do valor integral da importância de R\$102.761,69, ou seu parcelamento, nos termos do art. 81 da Portaria 39/2017.

2) Ocorre que, após diligências realizadas em diversos setores da Administração Municipal foi localizado a versão original e final do Anteprojeto, datado de 23 de fevereiro de 2011, realizado pela empresa contratada e pago pelo município com recursos oriundos do Convênio em tela, e acostado ao processo de prestação de contas na data de 29/07/2019 (divididos em 03 arquivos).

3) Contudo, em relação ao Relatório Prévio o único documento localizado é aquele que já se encontra anexado ao processo. Note, porém que o relatório prévio é parte integrante, única e exclusivamente, da META 01 do Plano de trabalho (conforme abaixo transcrito), e sem o qual não se poderia realizar o projeto executivo confeccionado e já aprovado na prestação de contas em comento:

5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: MOBILIZAÇÃO - ASSINATURA DO CONTRATO, VISITORIA NO LOCAL, E CONFEÇÃO DE RELATORIO PREVIO.			
Unidade de Medida:	UN	Quantidade:	1.0
Valor:	R\$ 45.000,00		
Início Previsto:	17/12/2010	Término Previsto:	03/01/2011
Valor Global:	R\$ 300.000,00		
UF: PR	Município: 7657 - LAPA	CEP:	



Assinado digitalmente por:
PAULO CESAR FIATES FURIATI
200.849.439-04
30/07/2019 15:35:13

PREFEITURA
MUNICIPAL DE LAPA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2019 15:35:03-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSO: HTTPS://C.ATENDE.NET/5D408DE3570CA



Não obstante, este município, a fim de dar cumprimento ao determinado por este Ministério realizará a devolução do valor apontado na conclusão da prestação de contas.



Ex Positis, requer digno-se Vossa Senhoria em:

a. deferir a juntada, já realizada na data de 29/07/2019, do documento pertinente a versão original e final do Anteprojeto, datado de 23 de fevereiro de 2011, realizado pela empresa contratada e pago pelo município com recursos oriundos do Convênio em tela e, ao final, julgar regular a prestação de contas em relação a esse item, com a consequente exclusão a glosa do valor apontado de R\$ 60.000,00;

b. Determinar a revisão e atualização do valor pertinente a glosa de R\$ 45.000,00, relativa somente ao Relatório Prévio, para posterior devolução por parte do Município.

Atenciosamente,

Paulo Cesar Fiates Furiati
Prefeito do Município da Lapa

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2019 15:35 -03-00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE [HTTPS://C.ATENDE.NET/P5D408DE3570CA](https://c.atende.net/p5d408de3570ca)



Assinado digitalmente por:
PAULO CESAR FIATES FURIATI
200.849.439-04
30/07/2019 15:35:13

PREFEITURA
MUNICIPAL DA LAPA

Convênio Prefeitura Municipal da Lapa e Ministério do Turismo

Objeto:

Data: 28-02-2010

Empresa Vencedora: Morva Martins Arquitetura

Etapas do trabalho:

- 1- Relatório Prévio
- 2- Levantamento topográfico
- 3- Anteprojeto
- 4- Projeto básico
- 5- Projeto executivo

Itens não aceitos na prestação de contas

- 1- Relatório Técnico
- 2- Anteprojeto

Motivo: Não constou na prestação de contas feita em 22 de março de 2014 os relatórios físicos, mas apenas a notas pagas e o atestado de recebimento do produto contratado.

Justificativas:

Todos os serviços realizados eram conferidos e depois de atestados, realizados os pagamentos. Os documentos físicos não eram anexados imediatamente no sistema, mas arquivados em pasta específica na Secretaria de Planejamento/Convênios, para posterior prestação de contas.

Em 19 de março de 2014 foram anexados os documentos no sistema, ressalte-se quase uma centena de documentos, e cuja prestação de contas foi realizada em 22 de março de 2014.

Apenas em 2018 o Ministério do Turismo solicitou complemento do itens não aceitos.

Procedida a busca na pasta do convênio foram encontradas as notas e os termos de recebimento, mas não foram localizados os documentos físicos.

A Empresa contratada está desativada faz alguns anos, mas foi localizada a antiga Proprietária que não localizou o relatório técnico, porém enviou o anteprojeto.


Na sequencia foi produzido um relatório detalhado ao Ministério do Turismo comprovando o uso adequado dos recursos, notas atestadas e recibos de pagamento. Na mesma oportunidade foi esclarecido que para que o projeto básico e o executivo ter sido entregue e concluído somente se estes itens tivessem sido realizados e que se tratava de um questão administrativa, pois com provas de que os serviços foram realizados. Apesar de todas as explicações continuava a Prefeitura no cadastro de inadimplência do SICONV.

Por não se tratar de desvio de recurso ou má aplicações do dinheiro público, e para evitar uma demanda judicial, que enquanto continuasse estaríamos inadimplentes, resolvi promover o entendimento de devolução em parcelas. Desde então, estamos adimplentes com o Sistema de Convênios do Governo Federal e aptos a receber novos recursos.



3. ANEXO I - PROJETO PRELIMINAR VILA DO PRÍNCIPE



[illegible]

PVP-ARQ-02

Lapa

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

11-10-1964

1/2008

Date: 21/02/2019

Energy & Environmental Science



MUNICÍPIO DA LAPA
ESTADO DO PARANÁ

Folha
Nº 008
P

4. ANEXO II - PROJETO PRELIMINAR JRD ESPLANADA/MONTREAL



PARQUE VILA DO PRÍNCIPE - TRECHO 04
ESCALA: 1/500

LOCALIZAÇÃO DA PRANCHA



PRECHD 03

CONVENIÊNCIAS TOPográficas	
	LUA RESC
	ESTACIONAMENTO APPL
	PARQUE
	AMFIVE
	CURVA DE NIVEL
	COBERTO
	BOCA DE LAGO
	CHAMA
	CHATEAU DE VALLEE
	RE DE VALLEE
	TAUQUE
	DABUEN

continued from page 10

Christine Morva²Arquitetura

rua Buenos Aires, 465 c/ 83 Batel Carlton-PR
tel (41) 3027 4234 - chiara.cova@gmail.com

[illegible]

CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA

CIRCUITO HISTÓRICO E AMBIENTAL DA LAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA
PMLO CESAR FIANES FURIATI

CHRISTINE MORVA

4/13 2017 - 2018

PROJETO PRELIMINAR

PARQUE JARDIM ESPANADA/MONTREAL

PJE-ARQ-02



PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

ESTADO DO PARANÁ

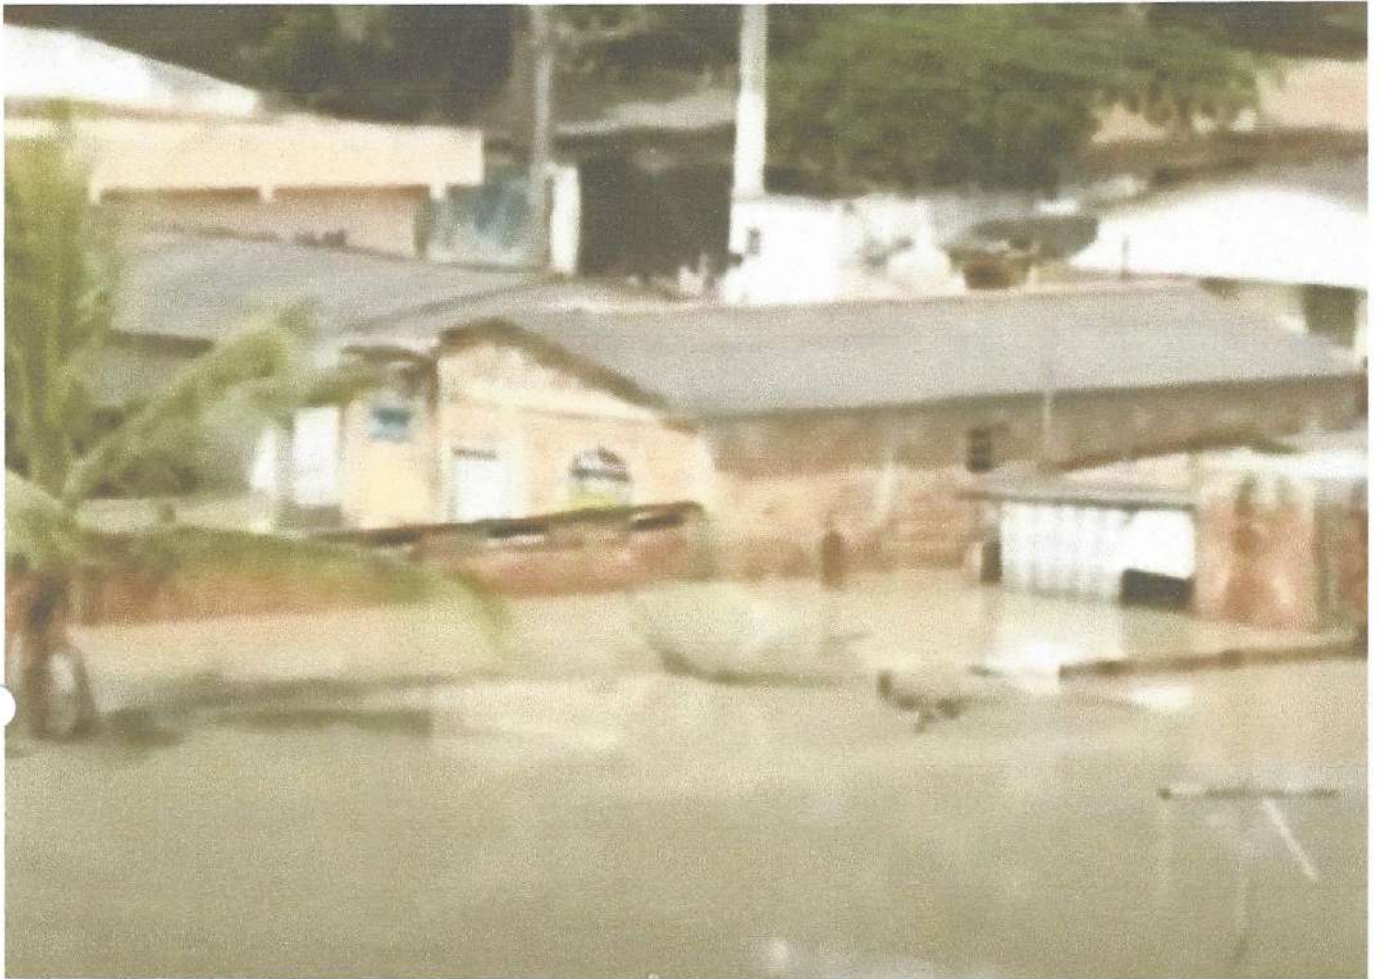
Alameda David Carneiro, 243 - Centro

CEP 83750-000 - (41) 3547-8000

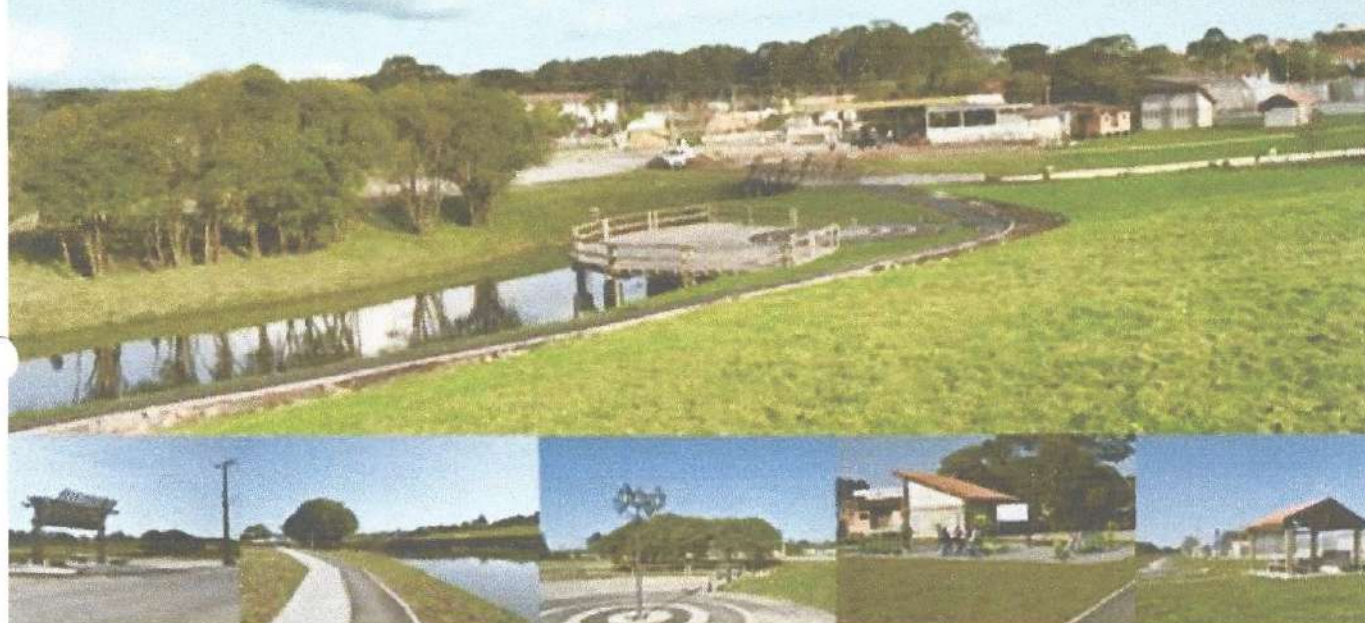

www.lapa.pr.gov.br

CADERNO 02

- ANEXO REPOSTA DO OFICIO Nº 108/2020 - CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA

















Iluminação do Parque Linear recebe investimentos na Lapa

Até agosto de 2012 em Lapa - Curitiba



Buscar melhorias em diversos espaços públicos é um dos trabalhos que vêm sendo realizados pela prefeitura da Lapa. No **Parque Linear**, inaugurado em 2012, foram registrados problemas de iluminação, principalmente por conta do vandalismo, motivo pelo qual foi realizado um estudo para corrigir esta falha.

Departamento Municipal de Iluminação Pública

Fez um novo projeto, considerando postes de quatro a nove metros de altura, com luminárias e fiação interna, além do aterramento mais profundo de toda a fiação. Os trabalhos tiveram início nesta semana e possuem investimento da prefeitura de R\$ 257 mil.

A obra, além de prevenir o vandalismo, proporcionará **mais segurança** para quem utiliza a pista de corrida e caminhada, que contará com iluminação correta e definitiva.

O Jornal
[\(http://tribunaregionaldalapa.com.br/o-jornal/\)](http://tribunaregionaldalapa.com.br/o-jornal/)
 Equipe
 Contato
[\(http://tribunaregionaldalapa.com.br/contato/\)](http://tribunaregionaldalapa.com.br/contato/)

GERAL ([HTTP://TRIBUNAREGIONALDALAPA.COM.BR/CATEGORIA/GERAL/](http://tribunaregionaldalapa.com.br/categoria/geral/))

Q

População reclama da falta de manutenção da Prefeitura

Fortes chuvas demonstram necessidade urgente de manutenção de obras e vias por parte da Prefeitura.

Na tarde de domingo, 1º de fevereiro, forte chuva atingiu a cidade da Lapa. Vários bairros foram atingidos pela tempestade. O grande volume de água caindo em tão pouco tempo demonstrou que, sem a devida manutenção, a galeria do Parque Linear, em breve, poderá não mais dar conta e enchentes podem voltar a ocorrer no entorno.

Os moradores da Vila Serafim do Amaral, preocupados com a situação, externaram o fato em grupos da rede social Facebook. Em suas declarações, relataram o abandono do bairro e do Parque Linear, pela Prefeitura da Lapa. O lago de retenção está à espera de limpeza, sendo que o Poder Executivo, no início de 2014, afirmou que estava estudando formas de realizar a manutenção adequada. Um ano se passou e nada de concreto foi feito. O mato cresce no local, obstruindo a passagem de água. O assoreamento é evidente, assim como a diminuição da capacidade de retenção do excesso de água.

O passado triste de enchentes na região pode estar com os dias contados diante do descaso com a manutenção do Parque.

PREJUÍZOS

Outro fato registrado na região, a cerca de 500 metros do córrego do Parque, foi o desmoronamento do muro dos fundos da residência de Marcos Antonio Meira de Lima, na Rua Doutor Francisco Alves Guimarães, nº 682, na Vila São José. O incidente ocorreu por volta das 20h, com a chegada da chuva e do vento forte. Agora, o proprietário está acionando a seguradora para reconstruir o muro.

RUAS E VIAS

Também há registro de indignação de moradores da Rua Conselheiro Alves de Araújo (conhecida como “rua da piscina”). Eles relatam que com as chuvas, a camada asfáltica está indo para o ralo, junto com o dinheiro público.

Nesta via, moradores decidiram, em forma de protesto, plantar árvores nos buracos existentes. Uma maneira de chamar a atenção dos motoristas, para que não se acidentem e não tenham prejuízos em seus veículos. Mas, principalmente, uma forma de chamar a atenção do poder público para que faça a devida manutenção da rua.

Outros exemplo de necessidade de atenção e manutenção podem ser vistos na Rua João Cândido Ferreira, em frente ao Centro da Juventude, que fica intransitável em dia de chuva; e a Rua Carlos Ganzert. As situações demonstram a necessidade urgente de limpeza e manutenção de bueiros, além de planejamento para escoamento da água.

MAIS LIDAS

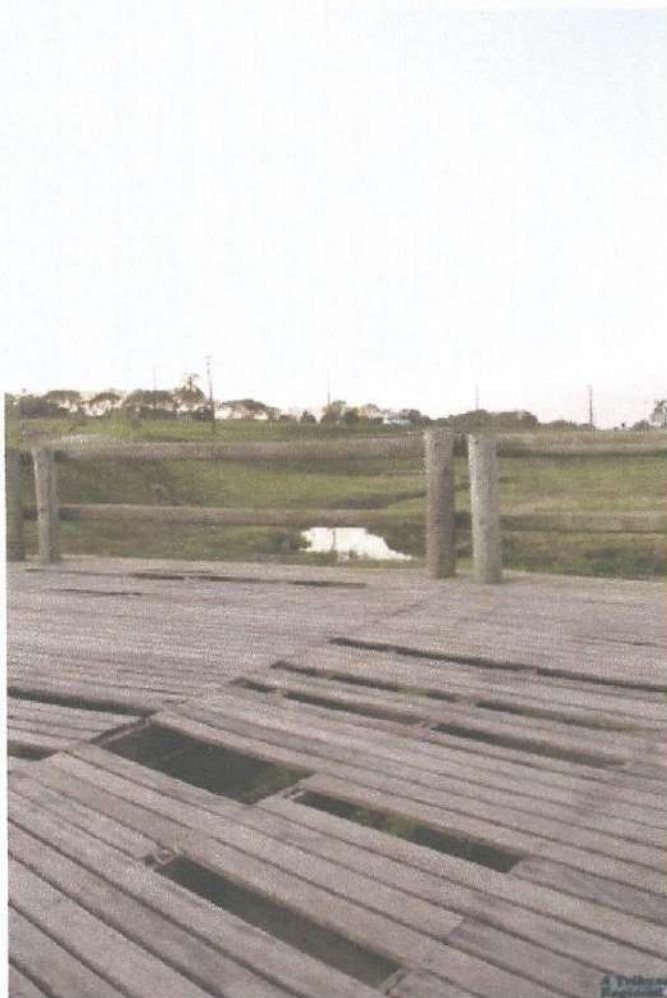
- 1 Policial (<http://tribunaregionaldalapa.com.br/categoria/policial/>)
Identificado Suspeito de ameaçar massacre no Colégio Estadual São José
[\(http://tribunaregionaldalapa.com.br/2019/04/12/identificado-suspeito-de-ameacar-massacre-no-colegio-estadual-sao-jose/\)](http://tribunaregionaldalapa.com.br/2019/04/12/identificado-suspeito-de-ameacar-massacre-no-colegio-estadual-sao-jose/)
- 2 Geral (<http://tribunaregionaldalapa.com.br/categoria/geral/>)
De avô para neto: talento visto no papel (<http://tribunaregionaldalapa.com.br/2013/01/21/de-avo-para-neto-talento-visto-no-papel/>)
- 3 Empresas (<http://tribunaregionaldalapa.com.br/categoria/empresas/>)
Erva Mate Legendária encerra atividades (<http://tribunaregionaldalapa.com.br/2019/03/15/erva-mate-legendaria-encerra-atividades/>)
- 4 Medicina (<http://tribunaregionaldalapa.com.br/categoria/medicina/>)
Morador da Lapa recebe primeiro transplante de pulmão no Paraná (<http://tribunaregionaldalapa.com.br/2019/12/19/morador-da-lapa-recebe-primeiro-transplante-de-pulmao-no-parana/>)



tribuna
konrad

Próximo de mais um aniversário, Parque Linear segue sem manutenção

Redação 17/08/2015 Tribuna Regional



Decks com madeiras podres, falta de iluminação adequada, lago que acabou ficando assoreado... Enfim, após quase quatro anos da inauguração de uma das maiores obras de reurbanização da história da Lapa, o descaso da administração com o local continua.

O tempo passa, mas o caso não muda... Em dezembro de 2011 o Parque Linear foi inaugurado. Uma das maiores obras de reurbanização da história da Lapa. O parque conta com um circuito de 1,5 km de extensão,

e recebeu benefícios como canalização do córrego (evitando novas ocorrências de enchentes nas residências do entorno) e espaços de lazer e esporte (com 6 quadras poliesportivas, academias ao ar livre, churrasqueiras, ciclovias e reurbanização).

Mas, passaram-se quase 4 anos desde a inauguração e o descaso da atual gestão municipal continua. O local está abandonado e sem a devida manutenção desde a inauguração. Onde havia um lindo lago, hoje, assoreado, vê-se apenas erva daninha e barro. A iluminação continua precária. Os decks sem a devida e simples manutenção, deterioram-se.

Recentemente, o leitor e fotógrafo Raphael Sampaio (foto da capa desta edição) registrou a urgência de atenção e manutenção no local. Ele fotografou o deck do parque e publicou em sua página na rede social Facebook: “Imagine uma criança caindo num buraco desses, perfurando o maxilar na ponta de um prego e ficando com sequelas pro resto da vida. Será que a prefeitura está esperando algo do tipo acontecer pra fazer o básico que é simplesmente manter o que já foi construído?”.

A preocupação de Raphael é a mesma de muitos moradores. E a preocupação não é só de hoje. Há tempos a Tribuna Regional vem registrando o descaso da administração Leila Klenk com o lugar.

Em janeiro de 2014, a Prefeitura divulgou que faria manutenção e projetaria adequação do Parque. Até agora (um ano e meio atrás), no entanto, nada de resultados práticos. À época, o diretor de Saneamento Ambiental da Lapa, Anderson Teixeira, afirmou: “Estamos trabalhando em um projeto que vai usar o dinheiro público para trazer melhorias definitivas ao parque; não adianta, agora, aplicarmos medidas que só resolvam o problema por um curto período de tempo e depois tragam mais gastos ao município”. Resta saber quando, efetivamente, medidas práticas serão adotadas.

RESPONSABILIDADE

Caso ocorra algum acidente com os frequentadores do Parque Linear, por conta da falta de manutenção do local, é possível entrar com ação judicial contra a Prefeitura. Isso porque, se provado que o Poder Executivo Municipal foi omissos com relação à conservação do Parque, terá de responder por eventuais danos causados aos usuários (por conta da falta de manutenção).

Caso parecido, foi julgado procedente no Rio Grande do Sul, por conta de um acidente ocorrido em um bueiro, por falta de manutenção da Prefeitura. O relator do caso, desembargador Cláudio de Mello Tavares, entendeu que “os transtornos pelos quais passou a autora decorreram da omissão do município, em relação a conservação da via pública, deixando o bueiro com a tampa aberta expondo a população ao risco de queda”.
